

CONSERVATION INTERNATIONAL - BRASIL



ASL

Programa
Paisagens
Sustentáveis
da Amazônia

**PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA
AMAZÔNIA - BRASIL**

(P158000 - GEF Paisagens)

**RELATÓRIO DE PROGRESSO
TÉCNICO-FINANCEIRO**

Período:

Janeiro a Junho de 2019

Brasília

Setembro de 2019

Segundo Relatório Técnico-Financeiro de Progresso apresentado ao Banco Mundial



ELABORAÇÃO E REVISÃO

Elaboração - Conservação Internacional Brasil

André Costa Nahur	Diretor para Estratégia da Amazônia
Neila Maria Cavalcante da Silva	Gerente Técnica - Projeto ASL
Marcelo Franco	Gerente de Orçamento e Finanças - Projeto ASL
Lara Regitz Montenegro	Coordenadora de Monitoramento - Projeto ASL

Revisão - Ministério do Meio Ambiente

Rodrigo Martins Vieira	Coordenador Geral de Conservação, Recuperação e Uso Sustentável de Ecossistemas - Secretaria de Biodiversidade
Otávio Gadiani Ferrarini	Analista Ambiental - Secretaria de Biodiversidade
Joao Arthur Soccal Seyffarth	Analista Ambiental - Secretaria de Biodiversidade
Moara Giasson	Analista Ambiental - Secretaria de Biodiversidade

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5
1. O PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - GEF ASL	6
2. RESUMO DE PROGRESSO	8
3. ANDAMENTO DAS ATIVIDADES	11
4. EXECUÇÃO FINANCEIRA	21
5. ATUALIZAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES	25
ANEXO	28

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar os resultados do segundo semestre de execução do GEF ASL P 158000 Acordo de Doação GEF nº TF A6056, abrangendo a execução das ações previstas no âmbito dos Componentes 2, 3 e 4 do Projeto no período de janeiro a junho de 2019, a partir das informações sistematizadas pela CI Brasil. Os resultados estão organizados por Componente e por Unidade Operativa.

O relatório contém as atividades executadas, os avanços em relação às metas propostas, a atualização dos indicadores do Projeto e a execução financeira no período.

O capítulo 1 apresenta uma descrição geral do Projeto ASL e sua organização em componentes.

O capítulo 2 traz o resumo financeiro do período, seguido da descrição do andamento das atividades (capítulo 3), sistematizadas por Componente e por Unidade Operativa.

No capítulo 4 é apresentada a execução financeira por componente, detalhando os valores executados por parceiro executor, além da execução financeira por categoria de despesa.

O capítulo 5 contempla o quadro de indicadores atualizados do projeto, enquanto no capítulo 6 - Próximos passos – são destacados os pontos a serem seguidos para a implementação do projeto no curto e no médio prazos.

1. O PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - GEF ASL

Descrição Geral

O Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (GEF-Paisagens) constitui um dos cinco projetos vinculados ao Programa ASL. O Programa ASL visa proteger as áreas de ecossistemas florestais globalmente relevantes e implementar políticas para promover o uso sustentável dos recursos naturais e a restauração da cobertura da vegetação nativa. Compreende projetos nacionais associados, executados por Brasil, Colômbia (dois projetos) e Peru (dois projetos). O Projeto nacional foi elaborado a partir das experiências de trabalho na Amazônia brasileira para fortalecer a conservação da biodiversidade, reduzir o desmatamento e melhorar os meios de subsistência das comunidades. Juntos, os projetos integrantes do programa visam manter 73.000.000 ha de terras florestais, promover o manejo sustentável em 52.700 ha e apoiar ações que ajudarão reduzir as emissões de CO₂ em 300 milhões de toneladas até 2030. O Banco Mundial é a agência líder do programa e agência implementadora do projeto brasileiro, enquanto WWF e PNUD são as Agências Implementadoras do GEF para os projetos dos outros dois países. No projeto brasileiro, as agências executoras são o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) para o Componente 1 e a Conservation International - Brasil (CI Brasil) para os Componentes 2, 3 e 4.

Os componentes estão configurados da seguinte forma:

Componente 1. Sistema de Áreas Protegidas da Amazônia

O componente 1 tem por objetivo expandir e consolidar o sistema de áreas protegidas (Unidades de Conservação - UCs) de mais de 60 milhões de ha na Amazônia brasileira e avançar com os esforços em andamento para garantir a sustentabilidade financeira a longo prazo, ao capitalizar o Fundo de Transição (FT) do Programa ARPA. O FT visa aumentar gradualmente os recursos fornecidos pelos governos federal e estaduais ao Programa ARPA, ao mesmo tempo que diminuem os investimentos de doadores, de modo que, após um período de 25 (vinte e cinco) anos, esses governos financiem 100% dos custos do programa ARPA sem apoio do FT ou de quaisquer outros fundos de doadores.

Componente 2. Gestão Integrada da Paisagem

O componente 2 visa promover a gestão integrada da paisagem na Amazônia através de estratégias complementares que promovam a recuperação da vegetação nativa, desenvolvam sistemas produtivos sustentáveis, fortaleçam as cadeias produtivas e implementem arranjos de gestão

inovadores entre UCs. As atividades incidirão em áreas prioritárias nos estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Acre.

Componente 3. Políticas Voltadas para Paisagens Produtivas Sustentáveis e Recuperação da Vegetação Nativa

O componente 3 centra-se no fortalecimento da capacidade dos governos nacionais e estaduais para desenvolver e implementar políticas setoriais e mecanismos financeiros para reduzir o desflorestamento e promover a recuperação florestal, particularmente no que se refere à Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Código Florestal, Lei nº 12.651/2012); à Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Decreto nº 8972/2017); à Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei nº 11.284/2006) e políticas estaduais correlatas.

Componente 4. Coordenação de Projetos, Capacitação e Cooperação Regional

O componente 4 remete à coordenação, comunicação, gestão e monitoramento da implementação em todos os componentes, incluindo, dentre outros aspectos, a operacionalização da Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) pelo MMA, responsável por assegurar a implementação e o monitoramento do projeto.

2. RESUMO DE PROGRESSO

Resumo financeiro acumulado

O resumo financeiro trata da visão acumulada da execução financeira do Projeto no período de 04 de abril de 2017 a 30 de junho de 2019. A descrição detalhada por Componente e por categoria de despesa para o período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2019 é apresentada no item Execução Financeira.

VALOR R\$ RECEBIDO x EXECUTADO

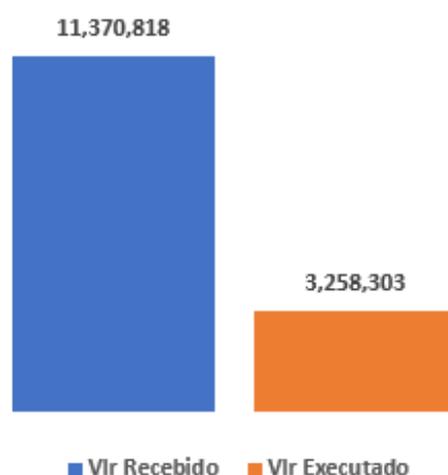


Figura 1 - Valor (R\$) recebido e executado de 04 de abril de 2017 a 30 de junho de 2019

VALOR R\$ EXECUTADO POR COMPONENTE

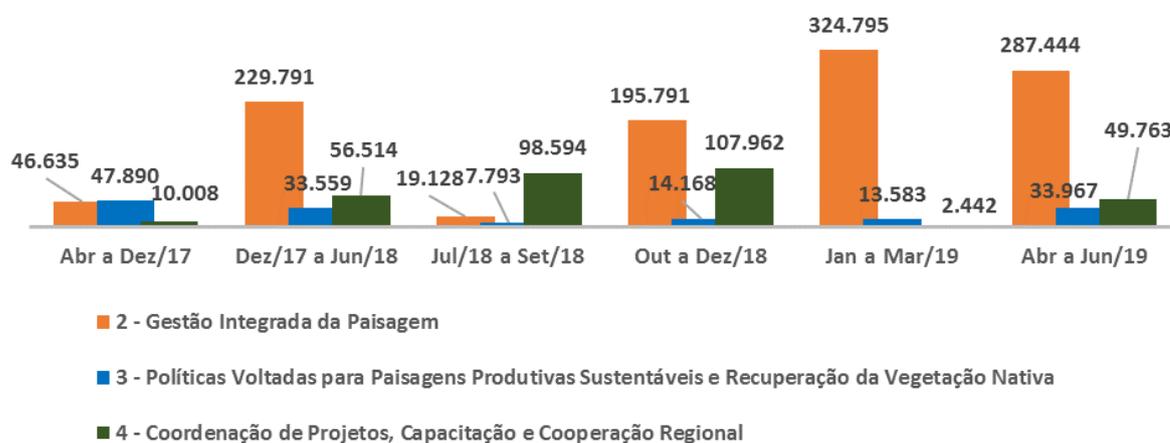


Figura 2 - Valor executado (R\$) por Componente no período de 04 de abril de 2017 a 30 de junho de 2019

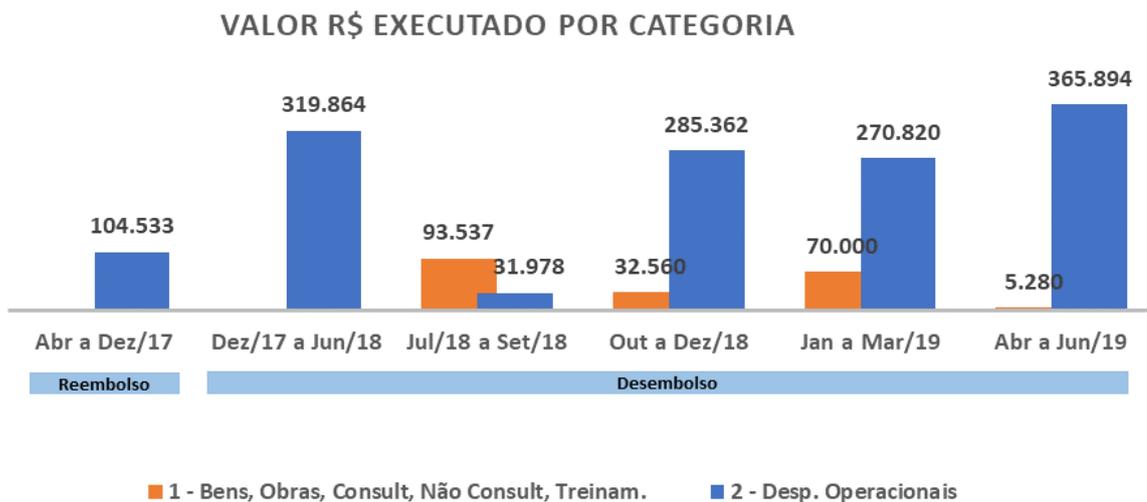


Figura 3 - Valor executado (R\$) por categoria de despesa de 04 de abril de 2017 a 30 de junho de 2019.

VALOR R\$ EXECUTADO NAS CATEGORIAS 1 e 2

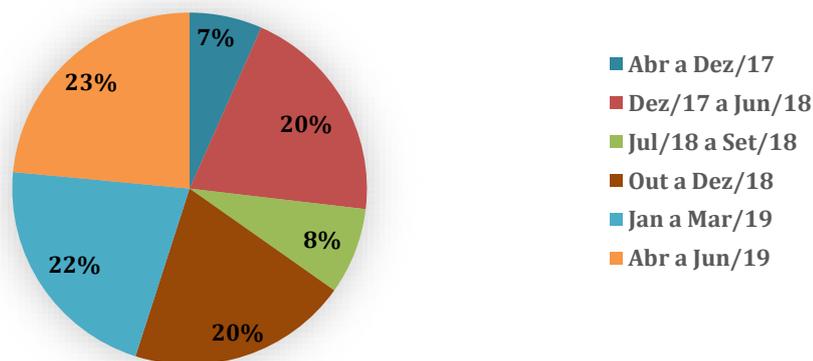


Figura 4 - Percentual executado cumulativo no período de 04 de abril de 2017 a 30 de junho de 2019 nas categorias de despesa: (1) Bens, Obras, Consultoria, Não consultoria e Treinamento; (2) Despesas operacionais

DESPESA R\$ COM REMUNERAÇÃO - EQUIPE ASL - CI BRASIL

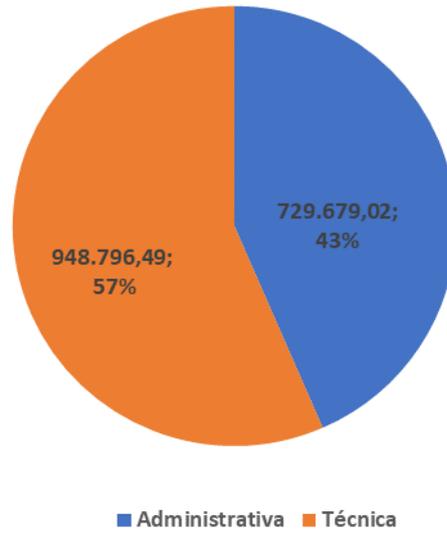


Figura 5 – Valor acumulado executado no período de 04 de abril de 2017 a 30 de junho de 2019 com remuneração das equipes técnica e operacional.

3. ANDAMENTO DAS ATIVIDADES

Descrição das atividades por componente

3.1 Componente 2. Gestão Integrada da Paisagem

As atividades estão descritas conforme especificado no POA 2018/2019 e estão organizadas por unidade operativa. No semestre reportado, a equipe esteve dedicada no realinhamento do planejamento com as Unidades Operativas diante de todas as mudanças políticas e governamentais e na elaboração dos Termos de Referência para contratação no segundo semestre de 2019.

3.1.1 SEMA - AC

A unidade operativa Sema Acre não executou nenhuma atividade no período. O status das atividades elencadas no POA vigente, no valor de R\$ 2.652.554,00, e especificamente no Componente 2 encontra-se no Quadro 1.

Quadro 1 - Status das atividades da Unidade Operativa Sema Acre (C2) até junho de 2019

ÓRGÃO/ATIVIDADES (INSUMO)	TOTAL ORÇADO R\$	STATUS DA ATIVIDADE
- SEMA AC	2.652.554,00	
COMPONENTE 2	2.578.469,00	
Aquisição câmaras de germinação tipo B.O.D.	21.000,00	Especificação técnica elaborada pela UO Para publicação pela CI
Aquisição capela de fluxo laminar	45.000,00	Não solicitado
Aquisição de computador desktop	10.000,00	Especificação técnica elaborada pela UO Para publicação pela CI
Aquisição de desumidificador	7.500,00	Especificação técnica elaborada pela UO Para publicação pela CI
Aquisição de vidraria para laboratório	5.000,00	Não solicitado
Aquisição GPS	6.000,00	Especificação técnica elaborada pela UO Para publicação pela CI
Aquisição luxímetro digital	3.000,00	Especificação técnica elaborada pela UO Para publicação pela CI
Aquisição nobreak	1.800,00	Especificação técnica elaborada pela UO Para publicação pela CI
Aquisição phmetro microprocessado de bancada	8.000,00	Especificação técnica elaborada pela UO Para publicação pela CI
Contratação de serviço técnico PJ para reforma do galpão de trabalho, casas de vegetação, de sombra e de aclimação e escritório administrativo	600.000,00	TDR em revisão pela CI
Contratação consultoria PJ para realizar o estudo de valoração de produtos associados à sociobiodiversidade	126.760,00	Não solicitado

Contratação de consultoria PF para realização de estudo de mercado para produtos da sociobiodiversidade	69.176,00	Não solicitado
Contratação de consultoria PJ para elaborar minuta da lei	50.000,00	Remanejado R\$ 27.000,00 para a linha de PRA
Contratação de consultoria PJ para mobilização, facilitação, relatoria e logística de 6 oficinas	227.158,00	Remanejado para linha de PRA
Contratação de consultoria PJ para mobilização, facilitação, relatoria para capacitação	50.000,00	Remanejado para linha de PRA
Contratação de serviço técnico PJ para implementar projeto recuperação	200.000,00	TDR em revisão pela CI
Contratação de consultoria PJ para a elaboração do plano de manejo da APA Igarapé São Francisco	350.000,00	TDR em revisão pela CI
Contratação de consultoria PJ para revisão do plano de manejo da APA Lago do Amapá + estudos complementares	350.000,00	TDR em revisão pelo MMA
Contratação de serviço técnico de pessoa física para implantação de viveiro comunitário	7.500,00	TDR em revisão pela CI
Contratação de serviço técnico para realização de reforma do Laboratório	264.060,00	150 mil para linha de PRA Não solicitado (*)
Contratação de serviço técnico PF para mobilização e relatoria das reuniões	22.000,00	Não solicitado

(*) Em revisão do orçamento, a Unidade Operativa verificou que os recursos eram insuficientes para contratação da atividade de elaboração do PRA (Programa de Regularização Ambiental).

3.1.2 SEMA - AM

A unidade operativa Sema Amazonas tem executado ações referentes à elaboração de Acordos de Pesca, com gastos operacionais com passagens, diárias e combustível. Os encontros comunitários têm permitido realizar levantamentos de informações referentes ao potencial pesqueiro da região onde estão sendo construídos os acordos, principais ambientes de pesca (zoneamento), petrechos de pesca utilizados, cotas de captura e principais espécies. Os principais desafios para a execução dessa política são sensibilizar todos os envolvidos sobre os benefícios dos acordos e trazer para a formalidade/legalidade todos os moradores e usuários dos ambientes, respeitando e cumprindo as regras para garantir os estoques pesqueiros. O público dos encontros são os moradores das áreas pretendidas, entidades de pesca, prefeituras municipais e usuários. As mulheres têm sido atuantes nos processos de construção dos acordos.

O status das atividades elencadas no POA vigente no valor de R\$ 2.345.864,50 e especificamente no Componente 2 encontra-se no Quadro 2.

Quadro 2 - Status das atividades da Unidade Operativa Sema Amazonas (C2) até junho de 2019

ÓRGÃO/ATIVIDADES (INSUMO)	TOTAL ORÇADO R\$	EXECUTADO R\$	STATUS DA ATIVIDADE
- SEMA AM	2.345.864,50		
COMPONENTE 2	373.464,50	53.276,73	
Adiantamento de despesa (cozinheiro, aluguel de voadeira, piloto, combustível)	190.000,00	25.550,42	Realizadas 2 reuniões comunitárias em cada uma das seguintes localidades: UCs Puranga Conquista; Mosaico Apui, Flota Canutama, RDS Piagaçu-Purus e entorno da RDS Igapó-Açú (rio Tupana) com a finalidade de construir os Acordos de Pesca nessas áreas
		27.726,31	Reunião de preparação do Projeto Regional da Bacia do Putumayo-Içá (Gestão de águas internacionais), no âmbito do GEF (Global Environmental Facility) em Washington no período de 11 a 15 de junho de 2019
Aquisição de data show	2.500,00	0,00	Especificação técnica elaborada pela UO Para publicação
Aquisição de materiais e equipamentos (substrato, adubo, sementes, tubete...) (1)	50.824,50	0,00	Não solicitado
Aquisição de notebook	4.500,00	0,00	Especificação técnica elaborada pela UO Para publicação
Contratação de consultoria pj para realizar o diagnóstico e mapeamento dos fornecedores de sementes e mudas do Estado	50.000,00	0,00	TDR em revisão pela UO
Contratação de serviço técnico PJ para construção de um viveiro contemplando a elaboração do projeto técnico, a construção da obra e o sistema de irrigação (1)	82.000,00	0,00	Não solicitado
Contratação de serviço técnico PJ para diagramação e impressão o atlas dos acordos de pesca	10.000,00	0,00	Não solicitado

3.1.3 IDEFLORBio e SEMAS - PA

A unidade operativa IdeflorBio Pará tem executado ações referentes aos diagnósticos rurais participativos (DRP), com a finalidade de fomentar a implementação de cadeias produtivas da agricultura familiar, especialmente a cadeia do cacau. Os gastos operacionais foram com passagens, diárias e combustível.

O status das atividades elencadas no POA vigente no valor de R\$ 2.079.084,00 e especificamente no Componente 2 encontra-se no Quadro 3.

Quadro 3 - Status das atividades da Unidade Operativa IdeflorBio/Semas (C2) até junho de 2019

ÓRGÃO/ATIVIDADES (INSUMO)	TOTAL ORÇADO R\$	EXECUTADO R\$	STATUS DA ATIVIDADE
- IDEFLORBIO e SEMAS	2.079.084,00		
COMPONENTE 2	1.231.728,00		
Adquirir pacote de materiais dos viveiros (semente, adubo..)	126.000,00	7.788,00	Especificação técnica elaborada pela UO Em revisão pela CI
Aquisição calcário (saca 50 Kg)	2.700,00		Não solicitado
Contratação de consultoria PJ para realização dos estudos socioeconômico, ambiental e fundiário e consolidação dos planos de gestão na Flota Iriri	800.000,00		TDR em revisão pelo MMA
Contratação de consultoria para formatação de documentos técnicos (versão final)	5.000,00		Não solicitado
Contratação de consultoria PJ para formatar produto intelectual do IDEFLOR-Bio (DDF e DGMUC)	10.000,00		Não solicitado
Contratação de serviço de locação de trator com tratorista	1.800,00		Não solicitado
Contratação de serviço para confecção de placas de sinalização	30.000,00		TDR republicado
Contratação de serviço técnico para diagramação e impressão de documentos técnicos (versão final)	40.000,00		Reprogramado para POA 2019/2020
Contratação de serviço técnico PJ para diagramação e impressão de produtos intelectuais formatados (versão final)	20.000,00		Não solicitado

3.1.4 SEDAM - RO

A unidade operativa Sedam Rondônia não executou nenhuma atividade no período. O status das atividades elencadas no POA vigente no valor de R\$ 5.317.168,00 e no Componente 2 encontra-se no Quadro 4.

Quadro 4 - Status das atividades da Unidade Operativa Sedam (C2) até junho de 2019

ÓRGÃO/ATIVIDADES (INSUMO)	TOTAL ORÇADO R\$	STATUS DA ATIVIDADE
- SEDAM	5.317.168,00	
COMPONENTE 2	545.268,00	
adiantamento de despesa (combustível L)	12.600,00	Não solicitado
Contratação de consultoria PJ para ministrar curso para capacitar extrativista na manutenção, funcionamento do viveiro e produção de mudas	100.000,00	Solicitou remanejamento para implementar viveiro (*)
Contratação de serviço técnico PJ para a construção do viveiro de mudas	70.000,00	TDR em revisão pela CI
Contratação de serviço técnico PJ para a produção de 100 mil mudas	100.000,00	Solicitou remanejamento para implementar viveiro
Custos operacionais (diárias)	262.668,00	Não solicitado

(*) Em revisão do orçamento, a Unidade Operativa verificou que os recursos eram insuficientes para implementação de viveiros para recuperação ambiental.

3.1.5 ICMBio

A unidade operativa ICMBio não executou nenhuma atividade no período. O status das atividades elencadas no POA vigente, no valor de R\$ 2.050.425,72, e especificamente no Componente 2 encontra-se no Quadro 5.

Quadro 5 - Status das atividades da Unidade Operativa ICMBio (C2) até junho de 2019

ÓRGÃO/ATIVIDADES (INSUMO)	TOTAL ORÇADO R\$	STATUS DA ATIVIDADE
- ICMBio	2.050.425,72	
COMPONENTE 2	1.850.425,72	
Aquisição de 02 quadriciclos	75.000,00	TDR republicado
Aquisição de câmera fotográfica	1.210,00	Não solicitado
Aquisição de data show	2.000,00	Não solicitado
Aquisição de material de construção e realização de todos os serviços necessários à obra	150.000,00	Não solicitado
Aquisição de notebook	2.000,00	Não solicitado
contratação de consultoria PJ para a realização de 04 oficinas de capacitação na RESEX Lago do Cuniã	80.000,00	Não solicitado
contratação de consultoria PJ para elaboração dos projetos básico e executivo necessários à construção de espaço coletivo na RESEX Alto Juruá	27.000,00	Não solicitado
Contratação de consultoria PJ para realização de estudos e elaboração de plano de negócios	60.000,00	No STEP
Contratação de consultoria pessoa física para identificação de comunidades com potencial para manejo da pesca	50.000,00	Não solicitado
Contratação de consultoria de pessoa física para elaboração de planejamento específico para a Flona Humaitá	74.000,00	Não solicitado
Contratação de consultoria pessoa física para avaliar a situação do desembarque pesqueiro em Manaus e Santarém	90.000,00	No STEP
Contratação de consultoria pessoa física para realizar mobilização das comunidades-alvo, organizar e moderar reunião de apresentação das pré-propostas e consulta quanto ao interesse e anuência, bem como elaborar pré-proposta de possíveis áreas e modelos de SF	42.000,00	No STEP
Contratação de consultoria PJ para capacitar servidores	50.000,00	Não solicitado
Contratação de consultoria PJ para identificar comunidades ao longo das bacias dos rios Juruá e Purus com interesse para manejar quelônios	90.000,00	Não solicitado
Contratação de PJ para fornecimento de alimentação	10.200,00	Não solicitado
Contratação de serviços de PJ para capacitação e formação de multiplicadores em SAF na RESEX Chico Mendes incluindo a disponibilização de equipamentos, fornecimento de insumos e assistência técnica por 30 meses	465.000,00	Não solicitado

Contratação de serviços PJ para fornecimento de alimentação (coffe break)	6.000,00	Não solicitado
Contratação de serviços técnicos para a perfuração e construção de um poço artesiano, incluindo caixa e bomba d'água	100.000,00	Não solicitado
Contratação de serviços técnicos para construção de uma pequena base de apoio para vigilância e monitoramento do pescado na RESEX Lago do Cuniã	140.000,00	Não solicitado
Contratação de serviços técnicos PJ para construção de casa de farinha comunitária, incluindo materiais e serviços	60.000,00	Não solicitado

3.2 Componente 3. Políticas Voltadas para Paisagens Produtivas Sustentáveis e Recuperação da Vegetação Nativa

A unidades operativas Sema Amazonas, Sedam Rondônia, IdeflorBio, ICMBio e Serviço Florestal Brasileiro iniciaram a elaboração dos TdRs com apoio das Coordenações Regionais da CI. O status das atividades elencadas no POA vigente para cada uma dessas UOs encontra-se nos Quadros 6 a 10.

3.2.1 SEMA - AM

Quadro 6 - Status das atividades da Unidade Operativa Sema Amazonas (C3) até junho de 2019

ÓRGÃO/ATIVIDADES (INSUMO)	TOTAL ORÇADO R\$	STATUS DA ATIVIDADE
COMPONENTE 3 (Sema Amazonas)	1.972.400,00	
Contratação de consultoria PJ para realização do estudo físico e antrópico	75.000,00	TDR em revisão pela UO
Contratação de consultoria PJ para realização do inventário amostral	350.000,00	No STEP
Contratação de consultoria para realizar diagnostico para concessão florestal (precificação e logisitica)	100.000,00	No STEP
Contratação de consultoria PJ para análise do CAR em áreas prioritárias no AM	1.400.000,00	No STEP

3.2.2 SEDAM - RO

Quadro 7 - Status das atividades da Unidade Operativa Sedam (C3) até junho de 2019

ÓRGÃO/ATIVIDADES (INSUMO)	TOTAL ORÇADO R\$	STATUS DA ATIVIDADE
COMPONENTE 3 SEDAM	4.771.900,00	
Contratação de consultoria PJ para elaboração do PRA por 66 meses	1.880.000,00	Não solicitado
Contratação de consultoria PJ para capacitar os técnicos	10.000,00	Não solicitado
Contratação de consultoria PJ para realização da análise do CAR por 25 meses	2.812.500,00	TDR em revisão pela CI
Contratação de serviço técnico para impressão do material didático/técnico	3.000,00	Não solicitado
Locação de auditório (aluguel de sala)	2.400,00	Não solicitado

Locação de salas didáticas (aluguel de sala)	9.000,00	Não solicitado
Pagamento de local para estadia de técnicos e instrutores (all inclusive - 55 pessoas - 2 cursos de 5 dias) (contração de serviço de logística: hospedagem, aluguel de sala e alimentação)	55.000,00	Não solicitado

3.2.3 ICMBIO

Quadro 8 - Status das atividades da Unidade Operativa ICMBio (C3) até junho de 2019

ÓRGÃO/ATIVIDADES (INSUMO)	TOTAL ORÇADO R\$	STATUS DA ATIVIDADE
COMPONENTE 3 ICMBio	200.000,00	
Contratação de consultoria PJ para a elaboração de documento técnico demonstrando possíveis cenários de manutenção de conectividade versus benefícios dos empreendimentos frente as vulnerabilidades da bacia do Tapajós	200.000,00	Não solicitado

3.2.4 SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO

Quadro 9 - Status das atividades da Unidade Operativa SFB (C3) até junho de 2019

ÓRGÃO/ATIVIDADES (INSUMO)	TOTAL ORÇADO R\$	STATUS DA ATIVIDADE
- SFB	1.970.000,00	
COMPONENTE 3	1.970.000,00	
Contratação de consultoria PJ para desenvolvimento de TAG RFID	200.000,00	Não solicitado
Elaboração de Estudos de Pesquisa de Mercado, Levantamento de Infraestrutura e logística para a Flona de Humaitá-AM	300.000,00	No STEP
Elaboração de Estudos de Pesquisa de Mercado, Levantamento de Infraestrutura e logística para a Flona de Jatuarana-AM	300.000,00	Aguardando publicação do estudo da Flona Humaitá para publicar
Elaboração de Estudos de Pesquisa de Mercado, Levantamento de Infraestrutura e logística para a Flona de Balata-Tufari- AM	420.000,00	Aguardando publicação do estudo da Flona Jatuarana para publicar
Elaboração de Estudos de Pesquisa de Mercado, Levantamento de Infraestrutura e logística para a Flona Iquiri-AM	450.000,00	Aguardando publicação do estudo da Flona Balata-Tufari para publicar
Elaboração de Estudos de Pesquisa de Mercado, Levantamento de Infraestrutura e logística para a Flonas de Pau-Rosa-AM	300.000,00	Aguardando publicação do estudo da Flona Iquiri para publicar

3.2.5 IDEFLORBIO

Quadro 10 - Status das atividades da Unidade Operativa IdeflorBio (C3) até junho de 2019

ÓRGÃO/ATIVIDADES (INSUMO)	TOTAL ORÇADO R\$	Status da Atividade
COMPONENTE 3	847.356,00	
Aquisição de computador desktop	27.000,00	Especificação técnica elaborada pela UO Para publicação
Aquisição de GPS	3.000,00	Especificação técnica elaborada pela UO Para publicação
Aquisição de Impressora	4.000,00	Especificação técnica elaborada pela UO Para publicação
Aquisição de nobreak	3.600,00	Especificação técnica elaborada pela UO Para publicação
Contratação de consultoria PJ para classificação do uso do solo e cobertura vegetal referente aos anos de 2018 das áreas cadastráveis do Estado do Pará	450.000,00	Remanejamento para análise do CAR
Contratação de consultoria PF para acompanhar a implementação da análise do CAR (Tutor) em São Felix e Altamira e elaborar manual operacional de procedimentos para análise do CAR nos municípios a partir da implantação assistida	100.000,00	TDR em revisão pelo MMA
Contratação de consultoria PJ para análise do Cadastro Ambiental Rural - CAR, na Plataforma SICAR/PA, baseados na sala de análise da DIORED/SEMAS-PA	250.000,00	TDR em revisão pela UO

3.3 Componente 4. Coordenação de Projetos, Capacitação e Cooperação Regional

No âmbito do Componente 4, foi contratada para realização de auditoria externa no Projeto GEF ASL. A auditoria foi iniciada em 24/06/2019 com previsão de conclusão em agosto de 2019 junto às equipes da CI Brasil no Rio de Janeiro e Brasília. O relatório final será enviado ao Banco Mundial na primeira quinzena de agosto e as recomendações serão acatadas pela CI. O valor contratado é de R\$ 90.000,00.

As demais atividades realizadas neste componente estão descritas a seguir.

3.3.1 SEMA - AC

A unidade operativa Sema Acre teve gastos operacionais para:

- i. Participação e exposição no 14º Encontro Brasileiro de Observação de Aves - Avistar Brasil 2019. Dois técnicos participaram do evento, com o objetivo de promover avanços para a consolidação do sistema de áreas protegidas do Acre.

- ii. Realização do 4º Encontro de Gestores de Áreas Protegidas (SEANP) do Acre no período de 03 a 06 de junho de 2019, no PAE Cachoeira. O encontro reuniu gestores de áreas protegidas de Unidades de Conservação federais e estaduais do Acre, da coordenação regional da FUNAI do Alto Purus, organizações não governamentais que atuam no Acre (Comissão Pró Índio do Acre, Conservação Internacional, Conselho Nacional dos Seringueiros e WWF-Brasil), além de Secretarias de Estado do Acre. Durante o evento foi elaborado um calendário coletivo de ações afins das APs que possuem relações institucionais e/ou conectividade de território, buscando sinergias e subsídios técnicos para ações com os conselhos gestores, monitoramento da biodiversidade, e iniciativas econômicas sustentáveis, como turismo de base comunitária e fortalecimento das cadeias de valor de produtos da sociobiodiversidade.

As ações do Componente 4 para a unidade operativa Sema Acre estão listadas no quadro 11.

Quadro 11 - Status das atividades da Unidade Operativa Sema Acre (C4) até junho de 2019

ÓRGÃO/ATIVIDADES (INSUMO)	TOTAL ORÇADO R\$	EXECUTADO R\$	STATUS DA ATIVIDADE
COMPONENTE 4	74.085,00		
Contratação de consultoria de moderação para mobilização e relatoria	5.500,00		Não solicitado
Contratação de serviço técnico PJ para diagramação revista SEANP	7.500,00		UO enviou TdR Em revisão pela CI
Despesas Operacionais (passagens e diárias)	28.585,00	12.773,06	Participação no 4º encontro de Gestores de Áreas Protegidas do Acre no período de 10 a 13/06/2019
	15.527,36	8.840,39	Participação e exposição no 14º Encontro Brasileiro de Observação de Aves - Avistar Brasil 2019, São Paulo

3.3.2 Unidade de Coordenação do Projeto - Ministério do Meio Ambiente (UCP/MMA)

O Ministério do Meio Ambiente tem executado custos operacionais. A principal atividade foi a participação de dois técnicos na discussão da Segunda Fase do Projeto Regional em evento do GEF em Washington no período de 7 a 14 de junho de 2019 e de três técnicos na Missão de Supervisão realizada nos dias 26 e 27 de junho em Manaus (AM).

A Unidade de Coordenação (UCP – MMA) elaborou com a agência implementadora o TdR para contratação da empresa para desenvolvimento do sistema de gestão do projeto GEF ASL. O TdR foi aprovado pelo Banco Mundial e tem previsão de publicação em agosto de 2019 e sua contratação será realizada até dezembro de 2019, com valor em torno de R\$ 500.000,00.

4. EXECUÇÃO FINANCEIRA

4.1 Execução Financeira por Unidade Operativa

MMA e Sema Amazonas têm sido os principais executores do orçamento, além da CI. No período de janeiro a junho de 2019, em relação ao orçamento previsto para o período, os recursos com gastos operacionais para essas unidades operativas estão indicados na figura 6. O saldo inicial planejado para o período foi de R\$ 17.758.283,66.

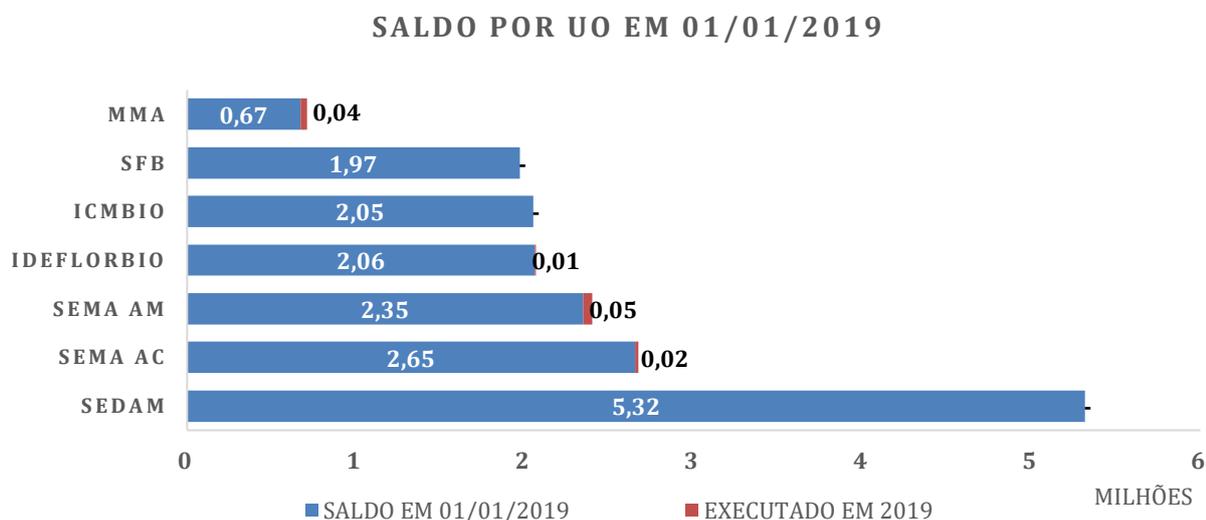


Figura 6 - Valor executado por unidade operativa no período e janeiro a junho de 2019

O gasto total para atividades no período analisado totaliza R\$ 711.993,78 para as unidades operativas, MMA e CI (exceto folha de pagamento), do valor total de R\$ 17.758.283,66 previstos para o POA 2018/2019, o que corresponde a 4% do total.

UO	SALDO EM 01/01/2019	EXECUTADO EM 2019	%
SEDAM	5.317.168,00	-	0,0%
SEMA AC	2.651.554,00	21.233,45	3,0%
SEMA AM	2.345.864,50	52.037,73	7,3%
IDEFLORBIO	2.060.178,75	6.106,50	0,9%
ICMBio	2.050.425,72	-	0,0%
SFB	1.970.000,00	-	0,0%
MMA	671.304,65	39.671,97	5,6%
CI BRASIL	691.788,04	592.944,13	83,3%
Total Geral	17.758.283,66	711.993,78	100%

Figura 6 - Saldo em 01/01/2019 acumulado abril de 2017 a junho de 2019 - MMA

Considerando o total do POA vigente a execução financeira acumulada por unidade operativa se encontra nas figuras de 7 a 11.

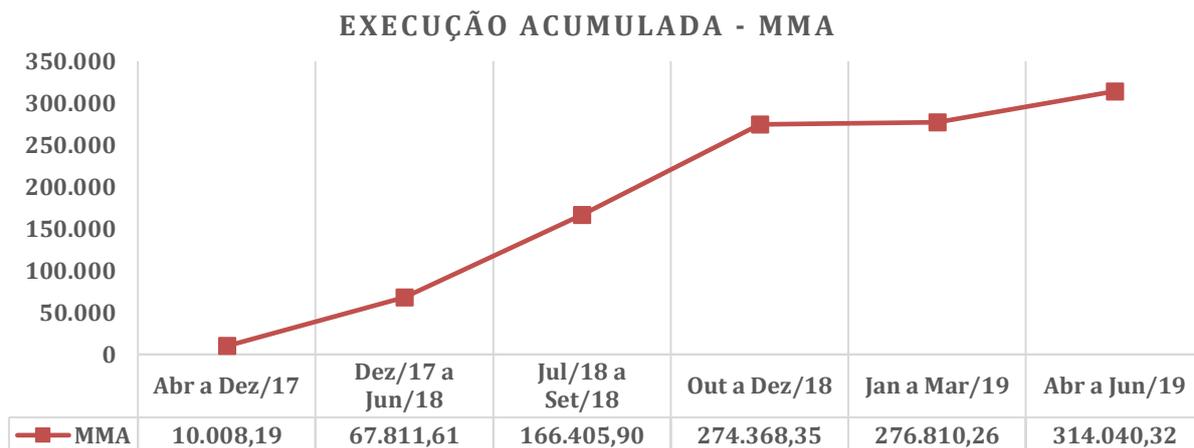


Figura 7 - Valor executado acumulado abril de 2017 a junho de 2019 - MMA

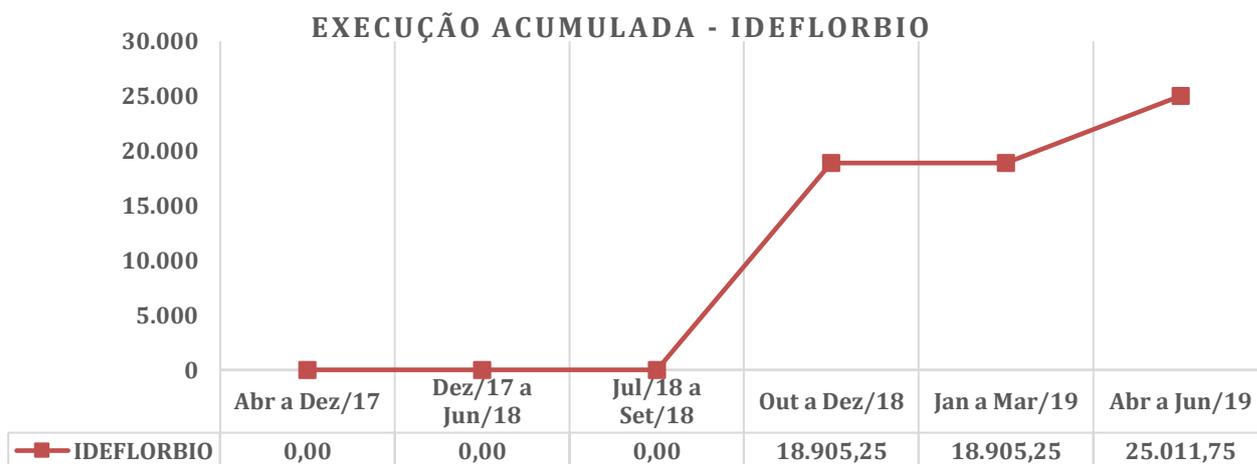


Figura 8 - Valor executado acumulado abril de 2017 a junho de 2019 - IdeflorBio

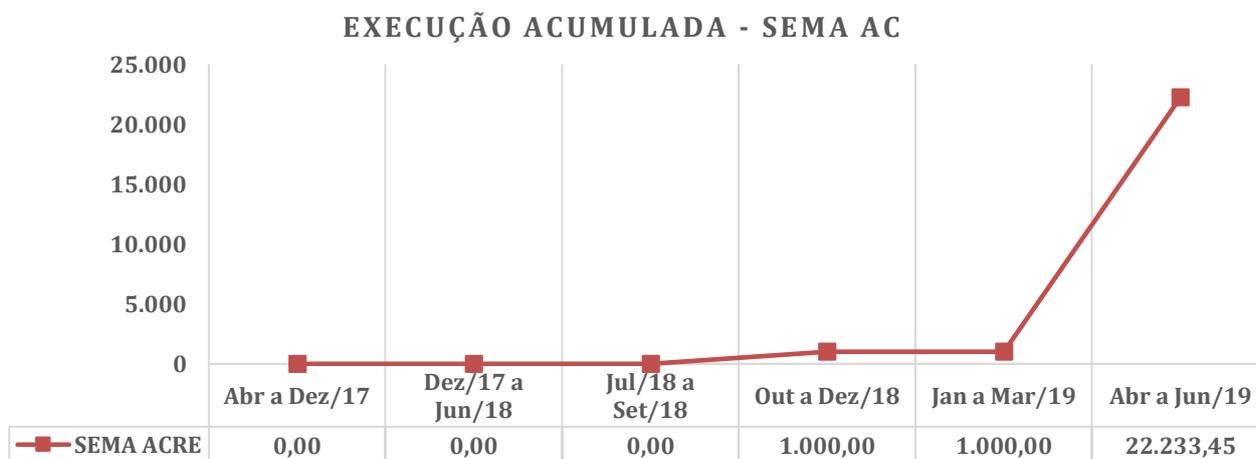


Figura 9 - Valor executado acumulado abril de 2017 a junho de 2019 - Sema Acre

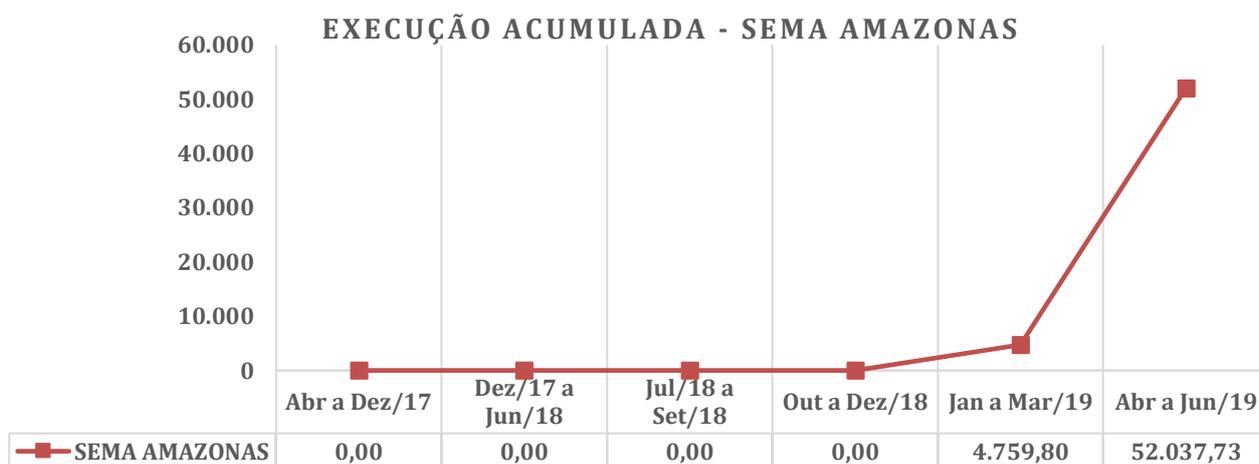


Figura 10 - Valor executado acumulado abril de 2017 a junho de 2019 - Sema Amazonas

4.2 Execução financeira por componente

A execução financeira do projeto é acompanhada por prestações de contas que se dão por meio das Declarações de Gastos (SOE).

Na figura 11 verifica-se a execução financeira por Componente, sendo que o de Coordenação de Projetos, Capacitação e Cooperação Regional (C4) foi o de maior valor executado, representando R\$ 727.696,93, referentes ao período reportado, incluindo folha de pagamento da equipe CI Brasil.

COMPONENTE	NO PERÍODO DE DESEMBOLSO (01/01/2019 até 30/06/2019)					
	PLANEJADO			EXECUTADO		
	CONTRAPARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRAPARTIDA	BIRD	TOTAL
Componente 2: Gestão integrada da Paisagem	0,0	612.238,61	612.238,61	0,0	612.238,61	612.238,61
Componente 3: Políticas Públicas e Planos voltados para a Proteção e Recuperação da Vegetação Nativa	118.257,87	47.550,14	165.808,01	118.257,87	47.550,14	165.808,01
Componente 4: Coordenação de Projetos, Capacitação e Cooperação Regional	0,0	727.696,93	727.696,93	0,0	727.696,93	727.696,93
TOTAL DO PROJETO	118.257,87	1.387.485,68	1.505.743,55	118.257,87	1.387.485,68	1.505.743,55

Figura 11 - Valor (R\$) executado por componente no período de janeiro a junho de 2019

4.3 Execução financeira por categoria de despesa

O monitoramento da execução financeira por categoria de gastos está diretamente relacionado às categorias de despesas especificadas pelo Contrato, como demonstrado na figura 12. A categoria com maior volume de recursos executados foi a de custos operacionais, categoria 2. O relatório encontra-se nos apêndices A e B.

II. Aplicações por Categoria						
Categoria das despesas						
(1) bens, obras, serviços e treinamento	-	75.279,98	75.279,98	-	75.279,98	75.279,98
(2) custos operacionais dos componentes 2,3 e 4	-	636.713,80	636.713,80	-	636.713,80	636.713,80
(3a) remuneração de pessoal técnico	-	420.736,67	420.736,67	-	420.736,67	420.736,67
(3b) remuneração de pessoal adm (operacional)	118.257,87	254.755,23	373.013,10	118.257,87	254.755,23	373.013,10
TOTAL DE APLICAÇÕES	118.257,87	1.387.485,68	1.505.743,55	118.257,87	1.387.485,68	1.505.743,55
SALDO FINAL NO PERÍODO	-	9.097.016,34	9.097.016,34	-	9.097.016,34	9.097.016,34

Figura 12 - Valor (R\$) executado por categoria de despesa no período de janeiro a junho de 2019

5. ATUALIZAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES

Os principais indicadores dos Componentes 2, 3 e 4, são os elencados no Quadro 10. O quadro de indicadores foi atualizado durante a Segunda Missão de Supervisão do Banco Mundial realizada nos dias 26 e 27 de junho de 2019, em Manaus - AM e inclui as contrapartidas das Unidades Operativas. O quadro completo encontra-se no anexo A.

Quadro 10 - Quadro de Indicadores do Projeto (C2, C3 e C4)

Indicadores Globais		
Nome do Indicador	Linha de Base	Avanços
Área sob restauração ou reflorestamento suportada pelo projeto desagregada por: (i) regeneração natural assistida (ii) restauração ativa) segundo critérios definidos (mil ha)	0.00 (i): 0.00 (ii): 0.00	<ul style="list-style-type: none"> • 2.500 ha em regeneração natural na Resex Rio Preto Jacundá e Mosaico Machadinho d'Oeste ambas em Rondônia (dados a serem validados com atividades de campo)
Área florestal maneja sob planos de manejo (milhões de Ha) - (Core)	0.00	<ul style="list-style-type: none"> • 900 mil ha correspondentes às Flonas Humaitá e Jatuarana, no Amazonas, sob gestão do ICMBio e a concessão sob gestão do SFB • 240 mil ha complexo de Florestas estaduais do Rio Gregório no Acre (em fase de lançamento dos editais)

Indicadores de Resultados Intermediários

Nome do Indicador	Baseline	Avanços
2.1 Área das propriedades rurais adotando práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos (mil ha)	0.00	<ul style="list-style-type: none"> • 9 mil ha (90 imóveis com média de 100 ha com adesão ao PRA em Rondônia e • 81 imóveis no Pará
2.2 Áreas protegidas de uso sustentável sob práticas sustentáveis de manejo da terra apoiadas pelo projeto de acordo com critérios definidos (milhões de Ha)	0.00	12 Acordos de pesca no Amazonas, realizados em 169 comunidades, 3331 famílias partícipes, correspondendo a 597.251,29 hectares
2.3 Área territorial sob práticas de gestão sustentável da terra (milhões de Ha) (Corporate)	0.00	Ações ainda não iniciadas
3.1 Propriedades rurais adotando ferramentas de planejamento de uso da terra para o manejo sustentável da terra (mil números)	0.00	<ul style="list-style-type: none"> • 12 mil CAR validados no Acre • 2 CAR validados no Amazonas • 6 mil CAR validados no Pará • 1.816 CAR validados em Rondônia
3.2 Mecanismos de incentivo para reduzir a perda florestal e aumentar a restauração melhoraram (Número)	0.00	Ações iniciadas para desenvolvimento de mecanismos no nível dos Estados
4.1 População local consultada sobre as atividades do projeto (desagregadas por sexo) (Número)	0.00 (of which Male: 0.00, Female: 0.00)	169 comunidades com 3331 famílias (levantar as questões de gênero)

6. OUTROS RESULTADOS

1. Auditoria financeira: a auditoria teve início no mês de junho e está em fase de conclusão;
2. Sistema de Gestão Físico-Financeira do Projeto: foi elaborado TdR, divulgado e está em processo de recebimento de propostas;
3. Mecanismos de monitoramento e avaliação das atividades realizadas e do impacto das ações do projeto: ainda não foi definida uma metodologia para realizar o monitoramento. Foi contratada uma pessoa para a posição que está em processo de capacitação e que será responsável pelo monitoramento e avaliação do projeto;
4. Espacialização dos dados nos principais temas do projeto (recuperação, manejo de pesca, manejo florestal, cadeias da sociobiodiversidade etc): o estado do Amazonas foi a única Unidade operativa que enviou os dados. Estamos no esforço para capturar as informações;
5. Estratégia Comunicação: foram definidos, em conjunto com MMA, os tipos, a composição e a estrutura dos materiais de comunicação, tais como folder, modelo de apresentação na extensão .ppt, e brindes, como camisa, mochila e bloco de papel. Estão em fase de finalização para a aquisição.
6. Manual Operacional do Projeto e cartilha orientadora sobre os procedimentos operacionais e fluxos de comunicação aos parceiros executores - unidades operativas: foi realizada uma análise dos principais pontos que devem ser atualizados e elaborado um roteiro do conteúdo a compor a cartilha. O formato e o conteúdo estão sendo avaliados em conjunto com a equipe técnica do MMA.
7. Assessoria técnica aos parceiros executores: as coordenações regionais estão dando apoio técnico às unidades operativas principalmente na elaboração dos termos de referência e especificações técnicas para realizar as aquisições e contratações.

7. PRÓXIMOS PASSOS

1. Capacitar as equipes técnicas das unidades operativas para elaboração de Termos de Referência;
2. Elaborar cartilha sobre procedimentos operacionais dos Componentes 2, 3 e 4;
3. Revisar o Manual Operacional;
4. Monitorar a contrapartida financeira junto às Unidades Operativas;
5. Espacializar os dados com informações sobre as ações do projeto junto às unidades operativas;
6. Contratar o Sistema de Gerenciamento do ASL;
7. Definir metodologia de monitoramento da execução do projeto;
8. Realizar oficinas de planejamento com as unidades operativas para definição das ações POA 2020/2021.

ANEXO

QUADRO DE INDICADORES E RESULTADOS DO PROJETO

Anexo A - Resultado de indicadores

Global Environmental Objectives

PDO Statement

The Project Development Objective (PDO) is to expand the area under legal protection and improve management of Protected Areas, and increase the area under restoration and sustainable management in the Brazilian Amazon.

These results are at Project Level

Global Environmental Objective Indicators

Indicator Name	Baseline	Cumulative Target Values							Advances
		YR1	YR2	YR3	YR4	YR5	YR6	End Target	
New area supported by the project with status as protected areas (million Ha)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	3.00	Foram criados a partir de 2017 863.461 ha A partir de 2016 2.287.646 ha
Area of existing protected areas supported by the project with (i) low, (ii) moderate and (iii) high management effectiveness as per defined criteria (million Ha)	Total: 60.00 Group 1: 10 Group 2: 44 Group 3: 6	Total: 60.00 Group 1: 10 Group 2: 44 Group 3: 6	Total: 60.00 Group 1: 8 Group 2: 44 Group 3: 8	Total: 60.00 Group 1: 5 Group 2: 40 Group 3: 15	Total: 60.00 Group 1: 3 Group 2: 38 Group 3: 19	Total: 60.00 Group 1: 0 Group 2: 36 Group 3: 24	Total: 60.00 Group 1: 0 Group 2: 34 Group 3: 26	Total: 60.00 Group 1: 0 Group 2: 34 Group 3: 26	Em 2018: 13 UCs no GI (11.813235 ha) 27 UCs no GII (14.183,198 ha) e 77 UCs no GIII (34.885,985 ha)

Area under restoration or reforestation supported by the project (disaggregated by (i) assisted natural regeneration, and (ii) active restoration) according to defined criteria (thousand Ha)	0.00 (i): 0.00 (ii): 0.00	0.00 (i): 0.00 (ii): 0.00	0.00 (i): 0.00 (ii): 0.00	4.00 (i): 3.40 (ii): 0.60	8.00 (i): 6.80 (ii): 1.20	18.00 (i): 15.30 (ii): 2.70	28.00 (i): 23.80 (ii): 4.20	28.00 (i): 23.80 (ii): 4.20	2.500 ha em regeneração natural na Resex Rio Preto Jacundá - RO e Mosaico Machadinho d'Oeste (dados a serem validados com atividades de campo)
Forest area brought under management plans (million Ha) - (Core)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4	1.4	1.4	900 mil ha (Flona Humaitá e Jatuarana - AM) e 240 mil ha complexo de Florestas estaduais do Rio Gregório -AC (em fase de lançamento dos editais)

Intermediate Results Indicators

Indicator Name	Baseline	Cumulative Target Values							Advances
		YR1	YR2	YR3	YR4	YR5	YR6	End Target	
1.1 Existing protected areas supported by the Transition Fund under improved management (Number)	65.00	65.00	90.00	105.00	114.00	114.00	114.00	114.00	117 UC recebendo recursos do FT (36 UCs consolidadas em manutenção)
1.2 Capitalization of the Protected Areas trust fund (Transition Fund) (million USD)	134.00	144.00	154.00	165.00	180.00	195.00	215.00	215.00	156.361.174
2.1 Area of rural properties adopting sustainable land management practices supported by the project according to defined criteria (thousand Ha)	0.00	100.00	200.00	300.00	500.00	700.00	900.00	900.00	9 mil ha (90 imóveis com média de 100 ha com adesão ao PRA - RO)

									81 imóveis (PA)
2.2 Sustainable use protected areas under sustainable land management practices supported by the project according to defined criteria (million Ha)	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	5.00	5.00	12 Acordos de pesca (AM), com 169 realizados em 169 comunidades, 3331 famílias correspondendo a 597.251,29 hectares
2.3 Land area under sustainable land management. practices (thousand Ha) - (Corporate)	0.00	100	200	1,304	2,508	3,718	5,928	5,928	Ações ainda não iniciadas
3.1 Rural properties adopting land use planning tools for sustainable land management (thousand Number)	0.00	2.00	4.00	9.00	14.00	20.00	27.00	27.00	CAR 1.816 validados (RO) 6 mil validados (PA) 2 validados (AM) 12 mil validados (AC)
3.2 Incentive mechanisms for reducing forest loss and increasing restoration improved (Number)	0.00	1.00	3.00	5.00	7.00	9.00	10.00	10.00	Ações iniciadas para desenvolvimento de mecanismos no nível dos Estados
4.1 Local people consulted on project activities (disaggregated by sex) (Number)	0.00 (of which Male: 0.00, Female: 0.00)	Total 600 Male: 420 Female: 180	Total 1,200 Male: 840 Female: 360	Total 1,500 Male: 1,050 Female: 450	Total 1,800 Male: 1,260 Female: 540	Total 2,400 Male: 1,680 Female: 720	Total 3,000 Male: 2,100 Female: 900	Total 3,000 Male: 2,100 Female: 900	169 comunidades com 3331 famílias

APÊNDICES

Apêndice A - Relatório Financeiro: Componentes de 01/01/2019 até 30/06/2019

AGÊNCIA EXECUTORA: CI INTERNACIONAL-TFOA6056

PROJETO: P158000

FONTES E APLICAÇÕES (IFR 1)

(Expresso em Reais)

Desembolso

	NO PERÍODO DE DESEMBOLSO (01/01/2019 até 30/06/2019)								
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO % (2)		
	CONTRAPARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRAPARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRAPARTIDA	BIRD	TOTAL
I. Fontes									
1. Saldo de abertura	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
2. Conta designada	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
3. Rendimentos	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
4. Fontes (origens) dos fundos	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
5. Contrapartida	118.257,87	-	118.257,87	118.257,87	-	118.257,87	0%	0%	0%
6. BIRD	-	1.387.485,68	1.387.485,68	-	1.387.485,68	1.387.485,68	0%	0%	0%
TOTAL DISPONÍVEL	118.257,87	1.387.485,68	1.505.743,55	118.257,87	1.387.485,68	1.505.743,55	0%	0%	0%
II. Aplicações por Categoria									
Categoria das despesas									
(1) bens, obras, serviços e treinamento	-	75.279,98	75.279,98	-	75.279,98	75.279,98	0%	0%	0%
(2) custos operacionais dos componentes 2,3 e 4	-	636.713,80	636.713,80	-	636.713,80	636.713,80	0%	0%	0%
(3a) remuneração de pessoal técnico	-	420.736,67	420.736,67	-	420.736,67	420.736,67	0%	0%	0%
(3b) remuneração de pessoal adm (operacional)	118.257,87	254.755,23	373.013,10	118.257,87	254.755,23	373.013,10	0%	0%	0%
TOTAL DE APLICAÇÕES	118.257,87	1.387.485,68	1.505.743,55	118.257,87	1.387.485,68	1.505.743,55	0%	0%	0%
SALDO FINAL NO PERÍODO	-	-	-	-	-	-			
SALDO DA CONTA DESIGNADA									

APÊNDICES

Apêndice B - Relatório Financeiro: Categoria de despesa - período acumulado de 04/04/2017 até 30/06/2019

AGÊNCIA EXECUTORA: CI INTERNACIONAL-TFOA6056

PROJETO: P158000

FONTES E APLICAÇÕES (IFR 1)

(Expresso em Reais)

Desembolso

	ACUMULADO NO PERÍODO DE 04/04/2017 a 30/06/2019								
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO % (2)		
	CONTRAPARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRAPARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRAPARTIDA	BIRD	TOTAL
I. Fontes									
1. Saldo de abertura	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
2. Conta designada	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
3. Rendimentos	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
4. Fontes (origens) dos fundos	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
5. Contrapartida	269.655,26	-	269.655,26	269.655,26	-	269.655,26	0%	0%	0%
6. BIRD	-	3.258.303,35	3.258.303,35	-	3.258.303,35	3.258.303,35	0%	0%	0%
TOTAL DISPONÍVEL	269.655,26	3.258.303,35	3.527.958,61	269.655,26	3.258.303,35	3.527.958,61	0%	0%	0%
II. Aplicações por Categoria									
Categoria das despesas									
(1) bens, obras, serviços e treinamento	-	201.377,03	201.377,03	-	201.377,03	201.377,03	0%	0%	0%
(2) custos operacionais dos componentes 2,3 e 4	-	1.378.456,81	1.378.456,81	-	1.378.456,81	1.378.456,81	0%	0%	0%
(3a) remuneração de pessoal técnico	47.193,46	948.790,49	995.983,95	47.193,46	948.796,49	995.989,95	0%	0%	0%
(3b) remuneração de pessoal adm (operacional)	222.461,80	729.679,02	952.140,82	222.461,80	729.679,02	952.140,82	0%	0%	0%
TOTAL DE APLICAÇÕES	269.655,26	3.258.303,35	3.527.958,61	269.655,26	3.258.303,35	3.527.958,61	0%	0%	0%
SALDO FINAL NO PERÍODO	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00			
SALDO DA CONTA DESIGNADA									
