

Programa Políticas sobre Mudanças do Clima - PoMuC

Um projeto da Iniciativa Climática Internacional (IKI)

Oficina de revisão da proposta do projeto PoMuC 2019

Moderação

Torsten Schwab

Rogério Cabral

Brasília

20 de novembro de 2019

On behalf of:



Federal Ministry
for the Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety

of the Federal Republic of Germany

Implemented by



Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

Participantes

MMA:

Adriana Brito da Silva
Alexandre Avelino
Andrea Oncala
Antônio C. M. Sanches
Clarisse E.F. Cruz
Celso L. M. Corrêa
Gabriela T.R. Lira
Hugo do Valle Mendes
Juliana Nunes
Mario H. R. Mendes
Patrícia M.S. de Abreu
Rafael Pereira Torino
Thiago Gil B. Barros

ME:

Ana Luiza Champloni
Hugo Mol
Klenize Chagas Fávero
Ricardo J.M. Santos

GIZ:

Anja Wucke
Kristina Kramer
Mayana Witt
Milena Terra
Nathalia Mamede
Raquel Souza

Moderação:

Rogério Cabral
Torsten Schwab

A lista de presença se encontra no anexo I.

On behalf of:



Federal Ministry
for the Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety

of the Federal Republic of Germany

Implemented by



Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

1. Boas-vindas

- Hugo do Valle Mendes (substituindo Adriano Santhiago de Oliveira) e Anja Wucke abriram a oficina, reconhecendo que a gestão do PoMuC atualmente tem um desafio grande com relação à governança do projeto, porque o que antes era condensado no Ministério do Meio Ambiente (MMA) em uma única secretaria, agora envolve novas secretarias e departamentos, mas que, mesmo assim, é necessário encontrar um caminho que possa fazer o PoMuC realizar suas ações;
- Destacou-se o objetivo da oficina: a revisão do conceito do projeto e alinhamento com a agenda política atual, redefinição das prioridades e ajuste com a prática do dia a dia. Ajustes no conceito dará bases para o Projeto de Cooperação Técnica Internacional (PCT) e para uma nova proposta ao Ministério do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha (BMU), que é necessária para a cooperação;
- Foram mencionados também os ofícios dos Estados que chegaram ao MMA/ Embaixada Alemã/ GIZ solicitando apoio ao PoMuC. Foi ressaltado que o BMU considera importante incluir o nível subnacional no processo de implementação da NDC;
- Além disso, foi ressaltado que o prazo dentro do Ajuste Complementar para assinar os Termos de Execução (TdE) do PoMuC é até o final do ano (31.12.2019); e que a extensão do componente de REDD+ e a reformulação do PoMuC devem ser abordadas pelo MMA nas negociações intergovernamentais que acontecerão no final de novembro.

Torsten Schwab (moderador), destacou que é preciso encontrar um novo norte para o PoMuC e que a oficina é esse lugar para discutir as ideias e possíveis formulações.

2. PoMuC: antecedentes e reorientação

- Hugo do Valle Mendes, Thiago Gil Barreto, Clarisse Cruz, Rafael Pereira Torino, Hugo Lancaster Mol e Ana-Luiza Champloni deram um pouco dos antecedentes do projeto e ressaltaram pontos importantes do panorama atual para o desenvolvimento do projeto;
- Foi destacado que o ano de 2019 foi um período para internalizar as orientações do novo governo, organizar a carteira de cooperação internacional dentro dos Ministérios, de forma a ter mais clareza e seletividade dentro dos novos e antigos projetos;
- Portanto, agora seria a primeira oportunidade de reorientar o projeto; lembrando que não seria criado algo definitivo na oficina, pois será necessária a aprovação por parte das instâncias superiores dos Ministérios brasileiro e alemão;
- Foi afirmado que deve se dar prosseguimento à formalização do TdE do projeto nos moldes da ABC e do Itamaraty; esperando que a realização da oficina resulte, até o final de dezembro, no PCT e no TdE, feitos e celebrados; para depois sendo possível chegar em uma via estruturada lógica, com indicadores e metas mensuráveis claros;

On behalf of:



Federal Ministry
for the Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety

of the Federal Republic of Germany

Implemented by



Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA


MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

- Foi ressaltado a importância da geração de novos negócios e do questionamento sobre como as mudanças do clima podem impactar os investimentos em geral e o agronegócio, em particular;
- Foi destacado o desejo de manter e expandir sempre o relacionamento entre os dois ministérios, para o sucesso da política ambiental do país;
- Para finalizar, alguns pontos orientadores foram colocados: quais as novas tendências? O que é importante para os dois lados da cooperação? O que o PoMuC deixa de legado para o fortalecimento da agenda e do governo brasileiro?


Torsten Schwab fez um resumo das falas anteriores sobre antecedentes e, sobretudo, sobre a reorientação do PoMuC, dizendo que, pelas falas, vê a necessidade de (i) pensar em aliar o crescimento econômico com o Meio Ambiente, pois “protegendo eu cresço”; (ii) gerar resultados concretos, visíveis e utilizáveis; e, (ii) valorização da cooperação técnica em termos de resultados, e não apenas em estudos. Dessa forma, resumiu as suas observações em 3 pontos orientadores: **Qualidade de vida, Valoração de Ativos Ambientais e Geração de Negócios Ambientalmente Sustentáveis.**



3. Definição da nova proposta do PoMuC: Outputs, indicadores, macroatividades, riscos e milestones (Sessão 1 & 2)

Os moderadores informaram que os respectivos Outputs iriam ser discutidos em duas sessões:

- **Sessão 1:** dois grupos, sendo um Output 2 + 7 e o outro Outputs 4 + 5
Participantes Output 2 + 7: Alexandre Avelino (MMA), Andrea Oncala (MMA), Antônio C.M. Sanches (MMA), Clarisse E.F. Cruz (MMA), Kristina Kramer GIZ), Mayana Witt (GIZ), Milena Terra (GIZ), Patricia M.S. de Abreu (MMA), moderado por Rogério Cabral
Participantes Output 4 + 5: Ana Champloni (ME), Anja Wucke (GIZ), Celso L. M. Corrêa (MMA), Gabriela T.R. Lira (MMA), Hugo do Valle Mendes (MMA), Hugo Mol (ME), Juliana Nunes (MMA), Raquel Souza (GIZ), Ricardo J.M. Santos (ME), moderado por Torsten Schwab
- **Sessão 2:** dois grupos, sendo um Output 1 e o outro Output 6, além de uma reflexão sobre o output 3
Participantes Output 1 e 3: Adriana Brito da Silva (MMA), Gabriela Lira (MMA), Hugo Mendes (MMA), Kristina Kramer (GIZ), Mario H.R. Mendes (MMA), Raquel Souza (GIZ), moderado por Rogério Cabral
Participantes Output 6: Ana Luiza Champloni (ME), Anja Wucke (GIZ), Hugo Mol (ME), Klenize Chagas Fávero (ME), Ricardo J.M. Santos (ME), Mayana Witt (GIZ), moderado por Torsten Schwab



Os resultados dos trabalhos em grupo podem ser encontrados no anexo III.

On behalf of:



of the Federal Republic of Germany

Implemented by



MINISTÉRIO DA ECONOMIA MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE



4. Apresentação dos resultados por Outputs

Essa atividade foi substituída por uma breve reflexão sobre o exercício anterior do trabalho em grupos, já que os moderadores acharam que o nível de resultados alcançados não valeria a pena ser apresentados na plenária nessa etapa do processo. O feedback recebido do exercício em grupo, da definição da nova proposta do PoMuC, foi de que, em geral, todos gostaram da atividade e perceberam a importância desta reflexão sobre os outputs e indicadores. Concordou-se, porém, que o tempo da atividade foi insuficiente para que se chegasse a um resultado mais bem elaborado e que, por isso, os trabalhos em grupo precisavam ser retornados num momento futuro em workshops menores dedicados apenas a um Output cada.

5. Roadmap para elaborar a proposta revisada, PCT e TdE

Como última atividade do dia foi construído em conjunto um *roadmap* sobre os próximos passos necessários para dar continuidade à elaboração proposta final do projeto, ao PCT e TdE correspondentes. Foram elaborados tanto as etapas necessárias nesse processo, como as pessoas responsáveis para cada etapa e os prazos para cumprir as mesmas.

O Roadmap pode ser encontrado no anexo IV.

6. Encerramento

O evento foi encerrado por falas por Anja Wucke e Hugo do Valle Mendes. Ambos agradeceram o empenho do grupo e os primeiros resultados alcançados e ressaltaram que ainda há um longo caminho a ser percorrido, como mostra o *roadmap* construído em conjunto. O moderador Torsten Schwab lembrou os participantes que a não assinatura do PCT, mesmo com o projeto já em andamento há um tempo, não seria uma exceção dentro da Cooperação Técnica (CT). Existem alguns casos dentro da CT onde o PCT foi assinado com o projeto já em andamento e, que não houve a necessidade em se considerar a fase prévia à assinatura do PCT como uma fase preparatória do projeto em si, até porque isso não seria aceito pelos respectivos doadores.

Por parte do MMA foi ressaltado que eles já estão em contato com a ABC para entender como poderão tratar essas questões. Após essas contribuições o evento foi encerrado pelos moderadores.

On behalf of:



Federal Ministry
for the Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety

Implemented by



Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

7. Anexo

Anexo I: Lista de presença



Termo de autorização de uso de imagem e voz

Na assinatura da lista de presença anexada, e para todos os fins de direito admitidos, o/a participante do evento, doravante denominado/a CEDENTE, autoriza expressamente a utilização de sua imagem e/ou voz, sem restrição de prazos, desde a presente data, em caráter total, definitivo, irrevogável, irretirável e gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da participação em atividade implementada em parceria com a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, doravante denominada CESSIONÁRIA com a atividade discriminada a seguir.

Projeto/PN:	13.9006.1-001.00
Evento:	Oficina de revisão da proposta do projeto PoMuC 2019
Local:	Sala de multimídia, 5º andar, Ministério de Meio Ambiente, Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Brasília-DF
Data:	20.11.2019
Responsável Técnico/a:	Raquel Souza

As imagens e a voz, registradas em fotos ou vídeos, com ou sem captação de som, poderão ser utilizadas pela CESSIONÁRIA com fins de difusão cultural, de informação pública e/ou de divulgação institucional, integralmente ou em parte, e exibidas em relatórios, em apresentações audiovisuais, em publicações e divulgações acadêmicas e/ou institucionais, em festivais e premiações nacionais e internacionais, assim como disponibilizadas no banco de imagens da GIZ, e dos demais integrantes institucionais da Cooperação Sustentável Brasil-Alemanha, e na internet, fazendo-se constar os devidos créditos de autoria e, sempre que possível, a citação do nome do/da CEDENTE.

O/A CEDENTE fica autorizado/a a reproduzir os respectivos materiais de comunicação veiculados, respeitando sempre os fins aqui estipulados.

Por ser esta a expressão de sua vontade, o/a CEDENTE declara ainda nada ter a reclamar a título de direitos conexos à sua imagem, voz ou qualquer outro.



Projeto/PN:	13.9006.1-001.00
Evento:	Oficina de revisão da proposta do projeto PoMuC 2019
Local:	Sala de multimídia, 5º andar, Ministério de Meio Ambiente, Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Brasília-DF
Data:	20.11.2019
Responsável Técnico/a:	Raquel Souza

Este evento será filmado/fotografado. Caso não deseje aparecer nas imagens marque no campo desta lista e comunique à organização. As imagens poderão ser utilizadas, sem fins lucrativos, pelos projetos implementados no âmbito da Cooperação Sustentável Brasil-Alemanha. Informações detalhadas sobre o termo de autorização de uso de imagem e voz estão na página 1 desta lista. **Não assinalar a coluna significa que você concorda que suas imagens/voz sejam divulgadas.**

Nº	NOME	INSTITUIÇÃO / PN	CARGO	ASSINATURA	E-MAIL	TELEFONE	NÃO AUTORIZO O USO DE IMAGEM
1	Anja Wulke	GIZ	Diretora	[Assinatura]	anja.wulke@giz.de	61 9815 15013	
2	Raquel Souza	GIZ	Assistente	[Assinatura]	raquel.souza@giz.de	61 99661 9611	
3	Maryana Witt	GIZ	Assistente	[Assinatura]	maryana.witt@giz.de		
4	Raquel Souza	GIZ	Assistente	[Assinatura]	raquel.souza@giz.de	61 99999411	
5	ALEXANDRE AVELINO	MMA	ANALISTA	[Assinatura]	ALEXANDRE.AVELINO@MMA.gov.br	61 2028 2459	
6	Antonio C.M. Sanchez	MMA	AA	[Assinatura]	antonio.sanchez@mma.gov.br	61 2028 2215	
7	Cláudia Cruz	MMA	Analista	[Assinatura]	claudia.cruz@mma.gov.br	61 2028 2278	
8	Tatiana Santos	GIZ	Coordenadora	[Assinatura]	tatiana.santos@giz.de	61-9818 0902	
9	Ricardo Santos	ME/SPE	A-DFC	[Assinatura]	ricardo.santos@me.gov.br	3412 2304	
10	WILSON B. BARROS	MMA/SRI	DIRETOR	[Assinatura]	wilson.barros@mna.gov.br	61 2028 2158	SIM
11	Kristina Krause	GIZ	Assessoria	[Assinatura]	kristina.krause@giz.de	61 9509 6254	
12	Maria Helena Mendes	MMA	Analista	[Assinatura]	maria.helena@mna.gov.br	61 2028 2602	
13	Camilla Milena Tereza	GIZ	Assessoria Técnica	[Assinatura]	camilla.milena@giz.de	61 99997 6541	SIM
14	Adriana Brito de Sá	SEI/MMA	Analista	[Assinatura]	adriana.brito@mna.gov.br	61 2028 2609	
15	Maya L. Mid	MMA/SE	Coordenadora	[Assinatura]	maya.l.mid@mna.gov.br	61 3412 2341	
16	Gabriela Trina	SRI/MMA	Coordenadora	[Assinatura]	gabriela.trina@mna.gov.br	61 2028 2602	
17	Juliana Nunes	SEI/MMA	Analista	[Assinatura]	juliana.nunes@mna.gov.br	61 2028 2602	
18	Klenize Favero	ME/SDIC	ACE	[Assinatura]	klenize.favero@me.gov.br	2027-7517	
19	Rafael Pereira	SRI/MMA	Analista	[Assinatura]	rafael.pereira@mna.gov.br	2028-2608	
20	celso L. M. Corrêa	DFNMA/SE	EPPOA	[Assinatura]	celso.correa@mna.gov.br	2028-2173	



Este evento será filmado/fotografado. Caso não deseje aparecer nas imagens marque no campo desta lista e comunique à organização. As imagens poderão ser utilizadas, sem fins lucrativos, pelos projetos implementados no âmbito da Cooperação Sustentável Brasil-Alemanha. Informações detalhadas sobre o termo de autorização de uso de imagem e voz estão na página 1 desta lista. **Não assinalar a coluna significa que você concorda que suas imagens/voz sejam divulgadas.**

Nº	NOME	INSTITUIÇÃO / PN	CARGO	ASSINATURA	E-MAIL	TELEFONE	NÃO AUTORIZO O USO DE IMAGEM
21	Ana Luiza Chompton	ME	AFFC	<i>Ana Luiza Chompton</i>	ana.chompton@fazenda.gov.br	3412-2335	
22	Nathalia Roveira	GIZ	Estagiária	<i>Nathalia</i>	fazenda.gov.br		
23	Hugo Mendes	SBI/MMA	Coord.	<i>Hugo Mendes</i>	hugo.mendes@mma.gov.br	2028-4452	
24	Andrie Amado	SFDS/MMA	Coord.	<i>Andrie</i>	andrie.amado@mma.gov.br	2028-4452	
25	Patricia Ab	SFDS/MMA	Analista	<i>Patricia</i>	patricia.abreu@mma.gov.br	2028-2456	
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

Anexo II

Objetivos

- Revisar conceito (Outcome, Outputs, indicadores, macroatividades, milestones e riscos associados) do projeto para elaborar proposta BMU;
- Elaborar proposta de próximos passos.

Resultados Esperados

- Conceito do projeto discutido com vistas à atualização para 2020-Nov\2021 e alinhado entre equipes MMA, ME e GIZ;
- Proposta de Outputs claramente definidos com indicadores, macroatividades, milestones e riscos associados para consideração de alto-nível;
- Proposta de Roadmap para dar continuidade à elaboração proposta final do projeto, ao PCT e TdE correspondentes.

Programação

Horário	Atividades
9h00-9h15	Café da manhã
9h15-9h45	Boas-vindas <i>Hugo do Valle Mendes, Coordenador-Geral de Economia Ambiental e Acordos Internacionais, Departamento de Economia Ambiental e Acordos Internacionais, Ministério do Meio Ambiente (MMA)</i> <i>Anja Wucke, Diretora do Programa Políticas sobre Mudança do Clima no Brasil, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Brasil</i> Programação <i>Torsten Schwab, moderador</i> Apresentação dos participantes
9h45-10h15	PoMuC: antecedentes e reorientação <i>Hugo do Valle Mendes, Substituto do Diretor do Departamento de Economia Ambiental e Acordos Internacionais e Diretor do PoMuC, Ministério do Meio Ambiente (MMA)</i> <i>Thiago Gil Barreto, Diretor do Departamento de Temas Globais e Organismos Multilaterais, Ministério do Meio Ambiente (MMA)</i>

On behalf of:



of the Federal Republic of Germany

Implemented by



MINISTÉRIO DA ECONOMIA MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE




	<p><i>Rafael Pereira Torino, Diretor do Fundo Nacional do Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente (MMA)</i></p> <p><i>Hugo Lancarter Mol, Coordenador de Política Agrícola e Meio Ambiente, Secretaria da Política Econômica, Ministério de Economia (ME)</i></p>
10h15-10h30	Coffee Break
10h30-12h00	<p>Definição da nova proposta do PoMuC: Outputs, indicadores, macroatividades, riscos e milestones (Sessão 1)</p> <p><i>Atividade em grupo</i></p>
12h00-13h30	Almoço
13h30-15h00	<p>Definição da nova proposta do PoMuC: Outputs, indicadores, macroatividades, riscos e milestones (Sessão 2)</p> <p><i>Atividade em grupo</i></p>
15h00-15h15	Coffee Break
15h15-16h45	<p>Apresentação dos resultados por output</p> <p><i>Torsten Schwab, moderador</i></p> <p><i>Rogério Cabral, moderador</i></p> <p><i>Representante de cada grupo</i></p>
16h45-17h45	<p>Roadmap para elaborar a proposta revisada, PCT e TdE</p> <p><i>Atividade em grupo</i></p>
17h45-18h00	<p>Encerramento</p> <p><i>Torsten Schwab, moderador</i></p> <p><i>Hugo do Valle Mendes, Coordenador-Geral de Economia Ambiental e Acordos Internacionais, Departamento de Economia Ambiental e Acordos Internacionais, Ministério do Meio Ambiente (MMA)</i></p> <p><i>Anja Wucke, Diretora do Programa Políticas sobre Mudança do Clima no Brasil, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Brasil</i></p>

Anexo III: Resultados dos Trabalhos em Grupo

Output 1: Transparência

Output 1	
Proposta novo Output Ferramenta de Transparência de Ações voltado à implementação da NDC está implementada	
Proposta Indicadores	
Pelo menos 2 setores têm indicadores estabelecidos para monitorar e implementar NDC até dezembro 2020	Ferramenta de comunicação do monitoramento definida e aplicada até julho 2021
	Sugestão Atividades Capacitar ao menos 50 pessoas para colaborar na implementação do sistema de transparência até meados de 2021.

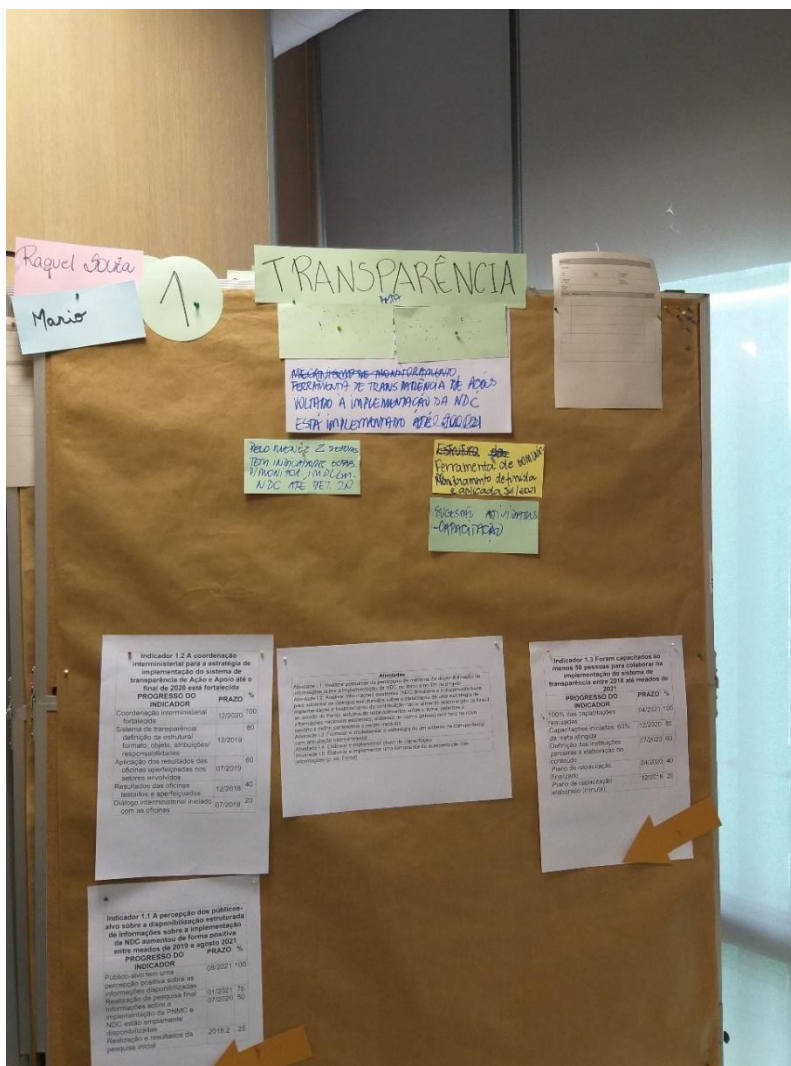

On behalf of:




of the Federal Republic of Germany

Implemented by



MINISTÉRIO DA ECONOMIA MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE



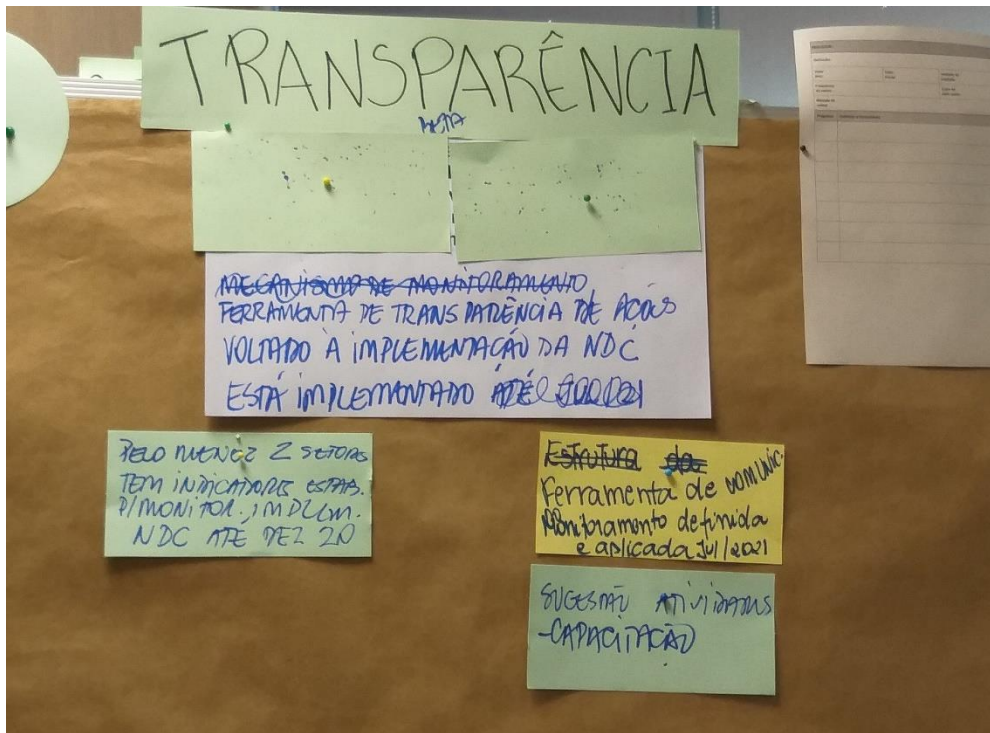

On behalf of:



of the Federal Republic of Germany

Implemented by



MINISTÉRIO DA ECONOMIA MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE



Output 2: REDD+

Output 2				
<p>Proposta Output</p> <p>Condições necessárias para a implementação da ENREDD+ aprimoradas, possibilitando captação por meio de pagamento por resultados e gerando benefícios sociais, ambientais e econômicos para a sociedade.</p>				
<p>Proposta Indicadores</p>				
<p>2 ferramentas estratégicas elaboradas e testadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Info Hub elaborado, testado e implementado até julho 2021 SISREDD+ na versão beta testado até novembro de 2021 	<p>Até 2021, pelo menos 80 % das reuniões das instâncias de governança da ENREDD+ contam com participação dos grupos que contribuem para o alcance dos resultados</p>	<p>Até julho 2021 garantir a revisão da ENREDD+</p>	<p>Estratégia de comunicação da ENREDD+ elaborada até novembro de 2021</p>	<p>Pelo menos 2 entes subnacionais elegíveis para captação de pagamentos por resultados até novembro de 2021</p>
<p>Proposta Atividades</p>				
<ul style="list-style-type: none"> Elaborar versão beta do Info Hub Brasil Implementar o Info Hub Brasil Elaborar a versão beta (piloto) do SISREDD+ Elaborar uma proposta de metodologia de avaliação das salvaguardas de REDD+ Validar funcionamento do sistema (Info Hub Brasil) Testar versão beta do SISREDD+ Validar versão beta do SISREDD+ 	<ul style="list-style-type: none"> Apoiar a participação das reuniões e espaços de governança da ENREDD+, de forma a garantir o respeito e cumprimento das salvaguardas C e D 	<ul style="list-style-type: none"> Identificar potenciais financiadores de REDD+, barreiras regulatórias e sinergias com fundos existentes Realizar estudo estratégico sobre viabilidade financeira (milestone) Realizar workshops sobre temas prioritários para a ENREDD+ 	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar plano de comunicação da ENREDD+ Produzir materiais informativos sobre a ENREDD+ Difundir a ENREDD+ para o seu público alvo 	<ul style="list-style-type: none"> Construir um roadmap para elegibilidade dos estados (milestone) Mapear status de cada estado em relação à resolução Apoiar o processo de elegibilidade para ENREDD+

On behalf of:





Implemented by



MINISTÉRIO DA ECONOMIA MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE



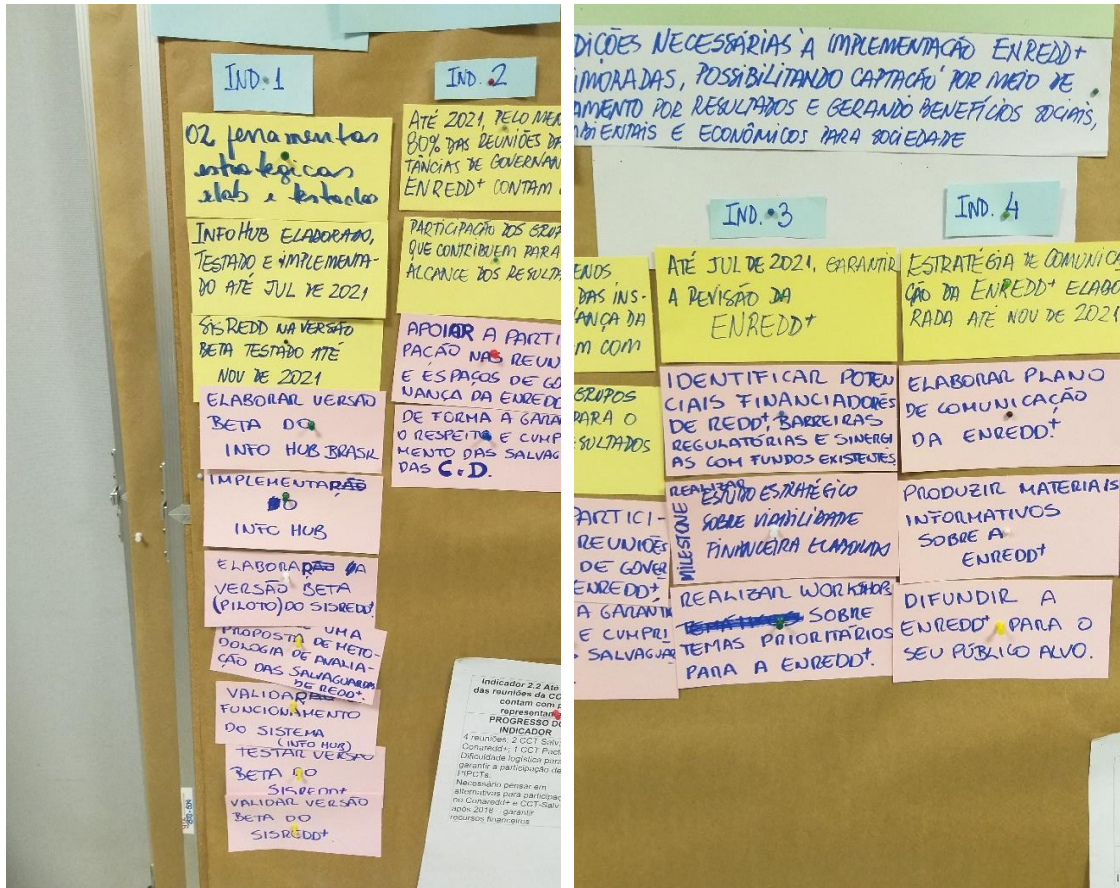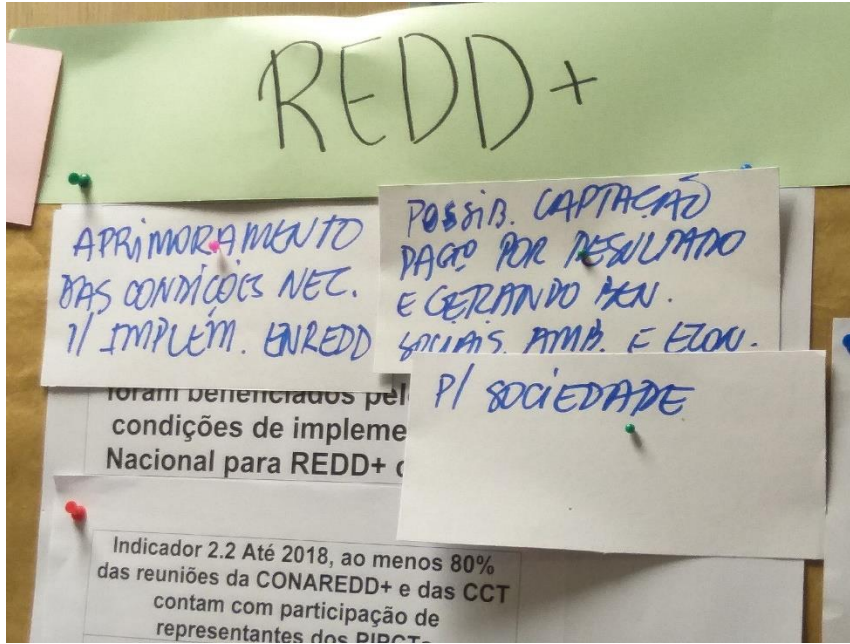

On behalf of:




of the Federal Republic of Germany

Implemented by



MINISTÉRIO DA ECONOMIA MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE



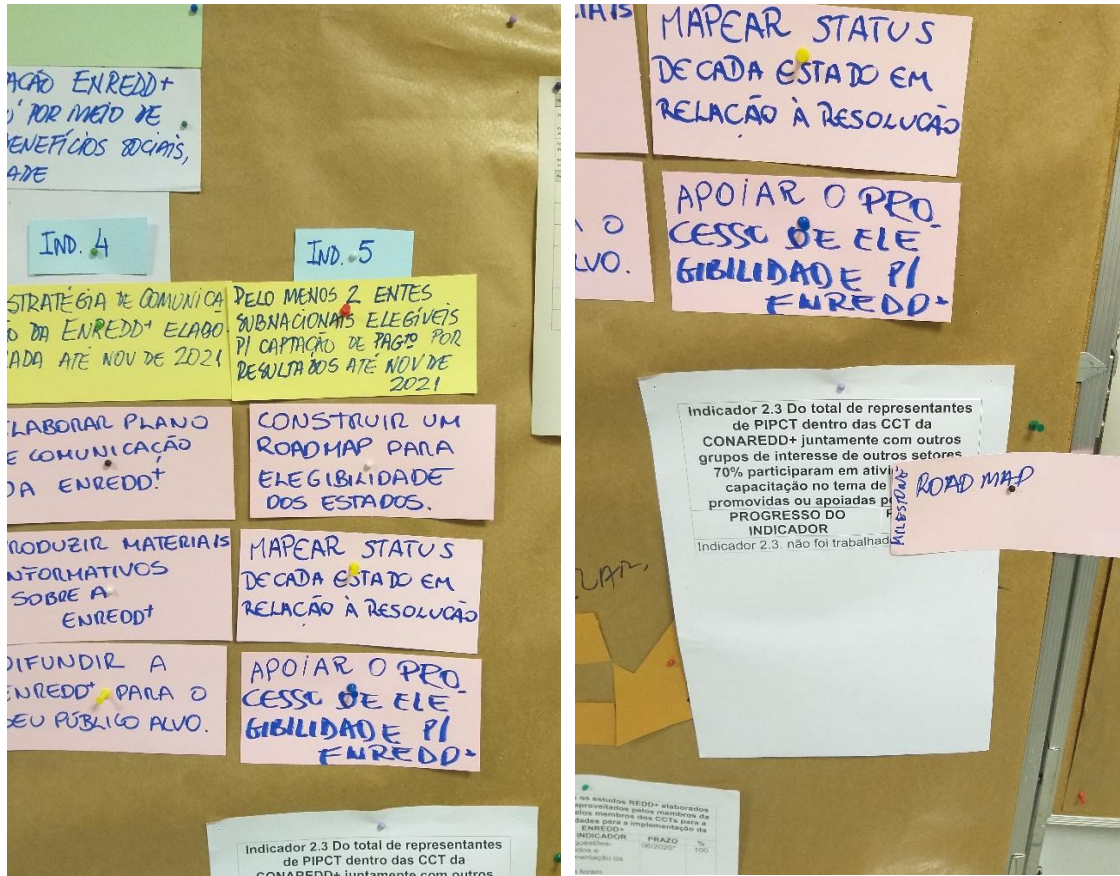

On behalf of:



of the Federal Republic of Germany

Implemented by




MINISTÉRIO DA ECONOMIA MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE



Output 3: Adaptação

Output 3
Devido ao grau de avanço desse Output foram elaboradas apenas ações necessárias para chegar a alcançar o 100 % dele dentro do projeto PoMuC:
Proposta Ações
<ul style="list-style-type: none">• Publicação mapas de vulnerabilidade• Para disponibilização do produto será necessário incorporar os metadados• Será solicitado à Gil/ consultor a incorporação dos metadados

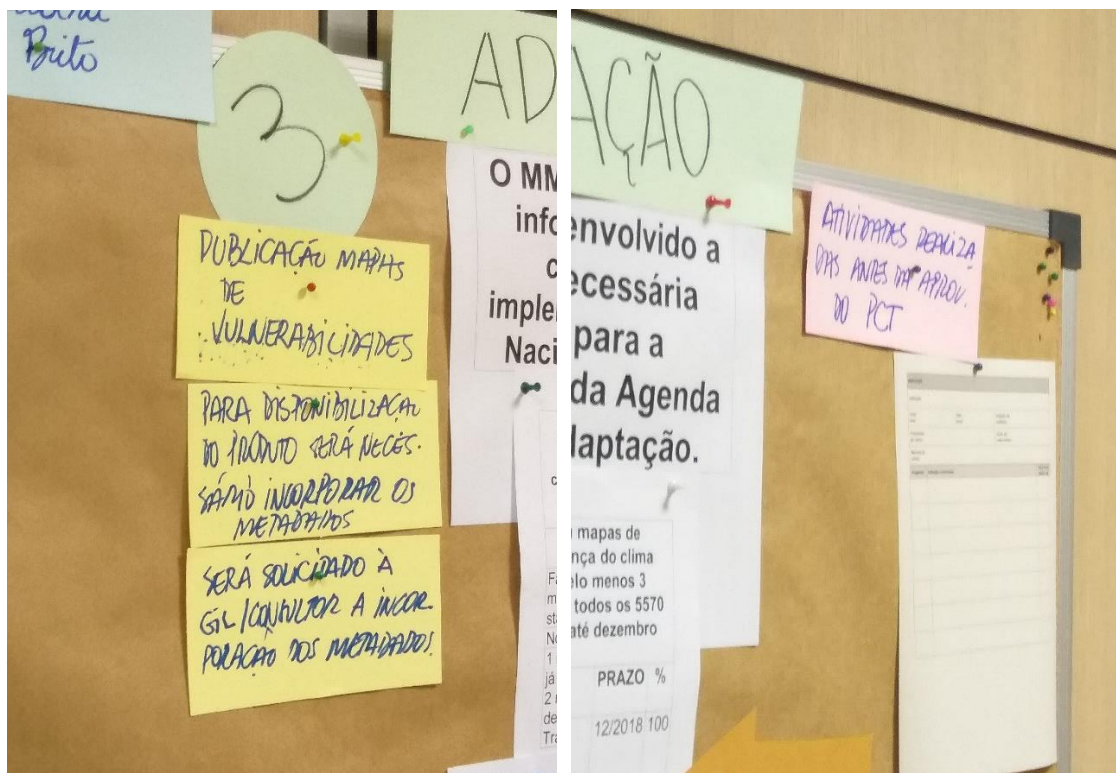

On behalf of:



of the Federal Republic of Germany

Implemented by






MINISTÉRIO DA ECONOMIA MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE



Output 4: Fundo Clima

Output 4
Proposta novo Output Não foi trabalhado
Proposta Indicadores Manual publicado
Proposta atividades Auxílio para elaboração de projetos?
Observação Cooperação com BNDES necessário

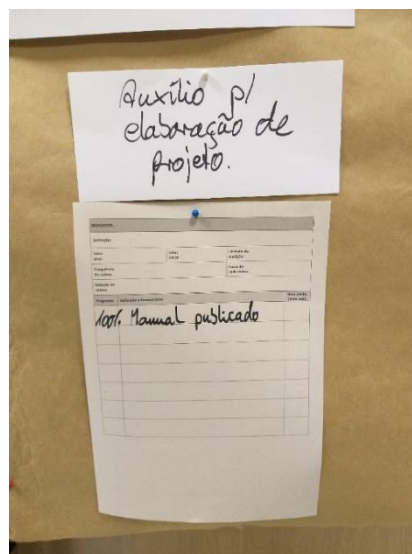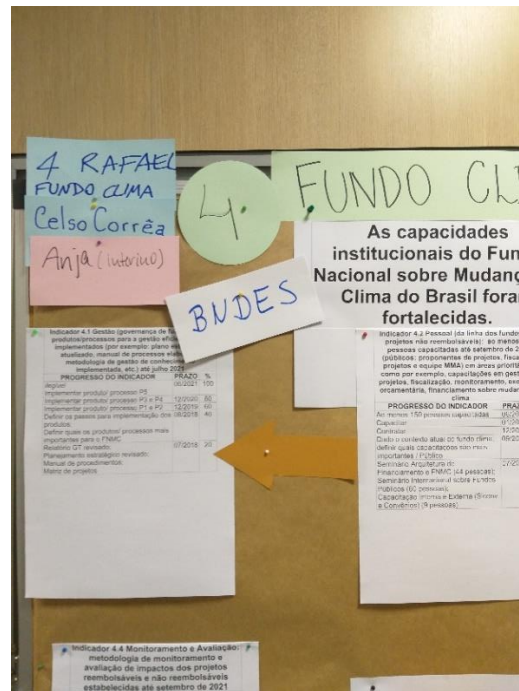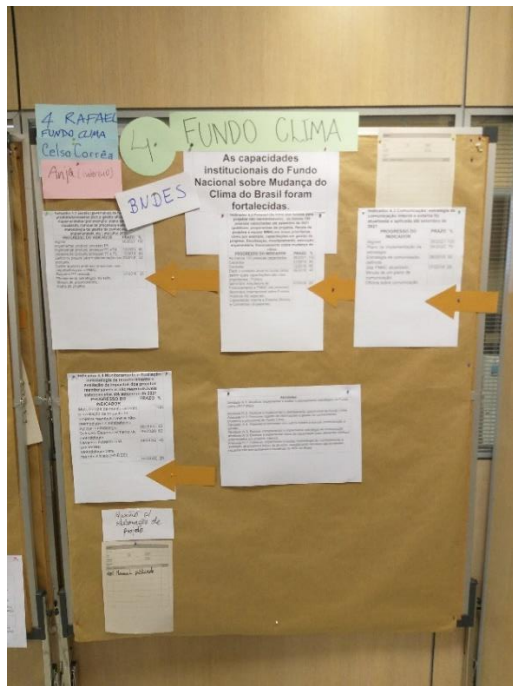

On behalf of:



of the Federal Republic of Germany

Implemented by





MINISTÉRIO DA ECONOMIA MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE





Output 5: Financiamento da Mudança do Clima

Output 5	
Proposta novo Output Não foi trabalhado	
Proposta Indicadores	
Mapeamento e monitoramento de fluxos financeiros para financiamento do clima (privado, público/ nacional e internacional)	Auxílio à captação de recursos
Exemplos para Progresso dos indicadores auxiliado pelo moderador	
<ul style="list-style-type: none"> • Terceira publicação publicada • Segunda publicação publicada • Primeira Publicação publicada • Equipe constituída e capacitada • Metodologias elaboradas • Informação disponível • Informação necessária definida 	<ul style="list-style-type: none"> • 100%: Pilotagem • 75%: Parceiros identificados • 50%: Instrumento publicado • 25%: Instrumento elaborado
Observações	
Projetos não tem qualidade necessária para serem financiados? Ponto vai para Output 4?	

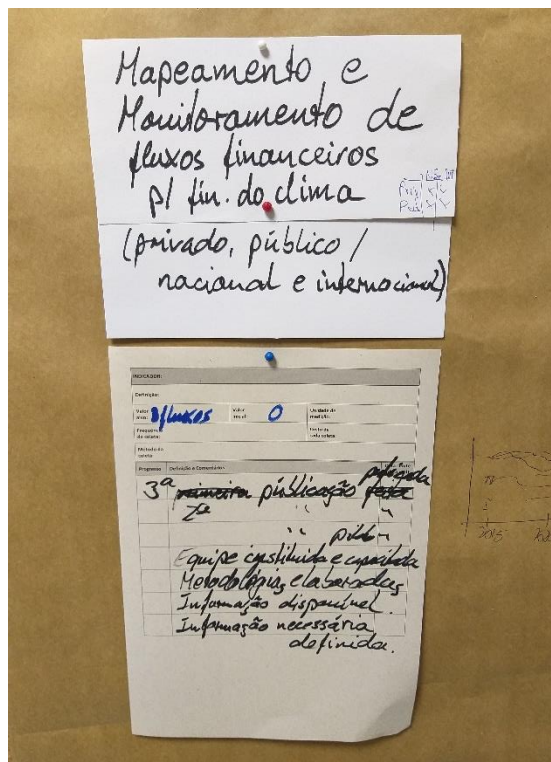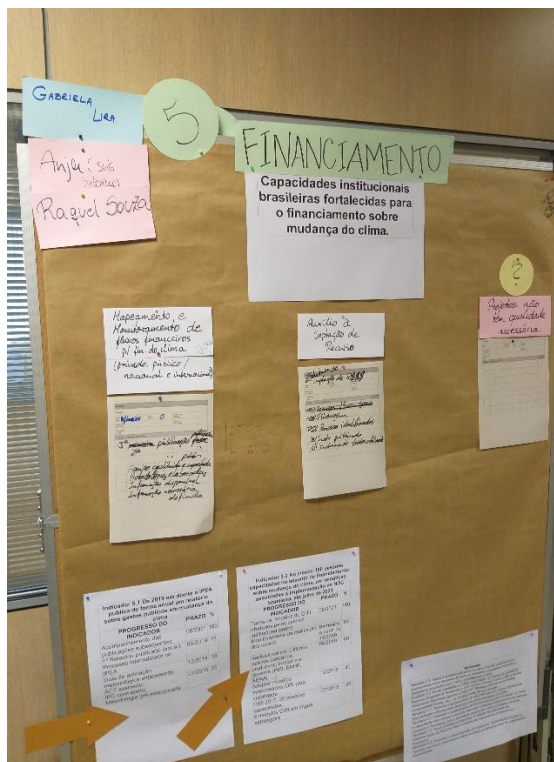

Output 6: Relato de emissões

Output 6
Proposta novo Output Não foi trabalhado
Proposta Indicadores Não foi trabalhado
Proposta atividades Não foi trabalhado
<p style="text-align: center;">Observações</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mudança do Output 6 para Secretaria de Infraestrutura, coordenação do Gustavo Fontenele • Coordenação com PMR • 4/2/20 Reunião Comitê Gestor do PMR + ME (Sec. Carlos Costa) + PoMuC (PNR-GEE) • GT Clima ABEMA • Prazo para decisão política? • Criação de lei? • Cooperação com MCTIC? • GT Inventários corporativos • Articulação com estados • Estratégia de comunicação • Verificação de dados • Papel do Ibama? • Setor privado: Orientar programas de fomento (R\$) aos menos competitivos?

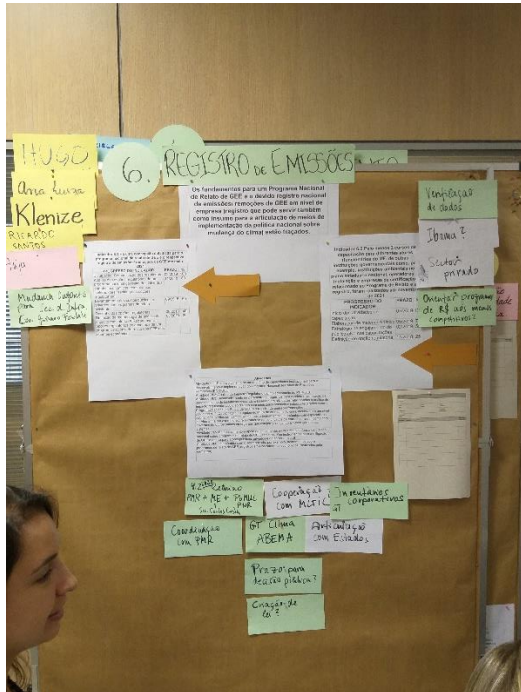

On behalf of:



of the Federal Republic of Germany

Implemented by




MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE




PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

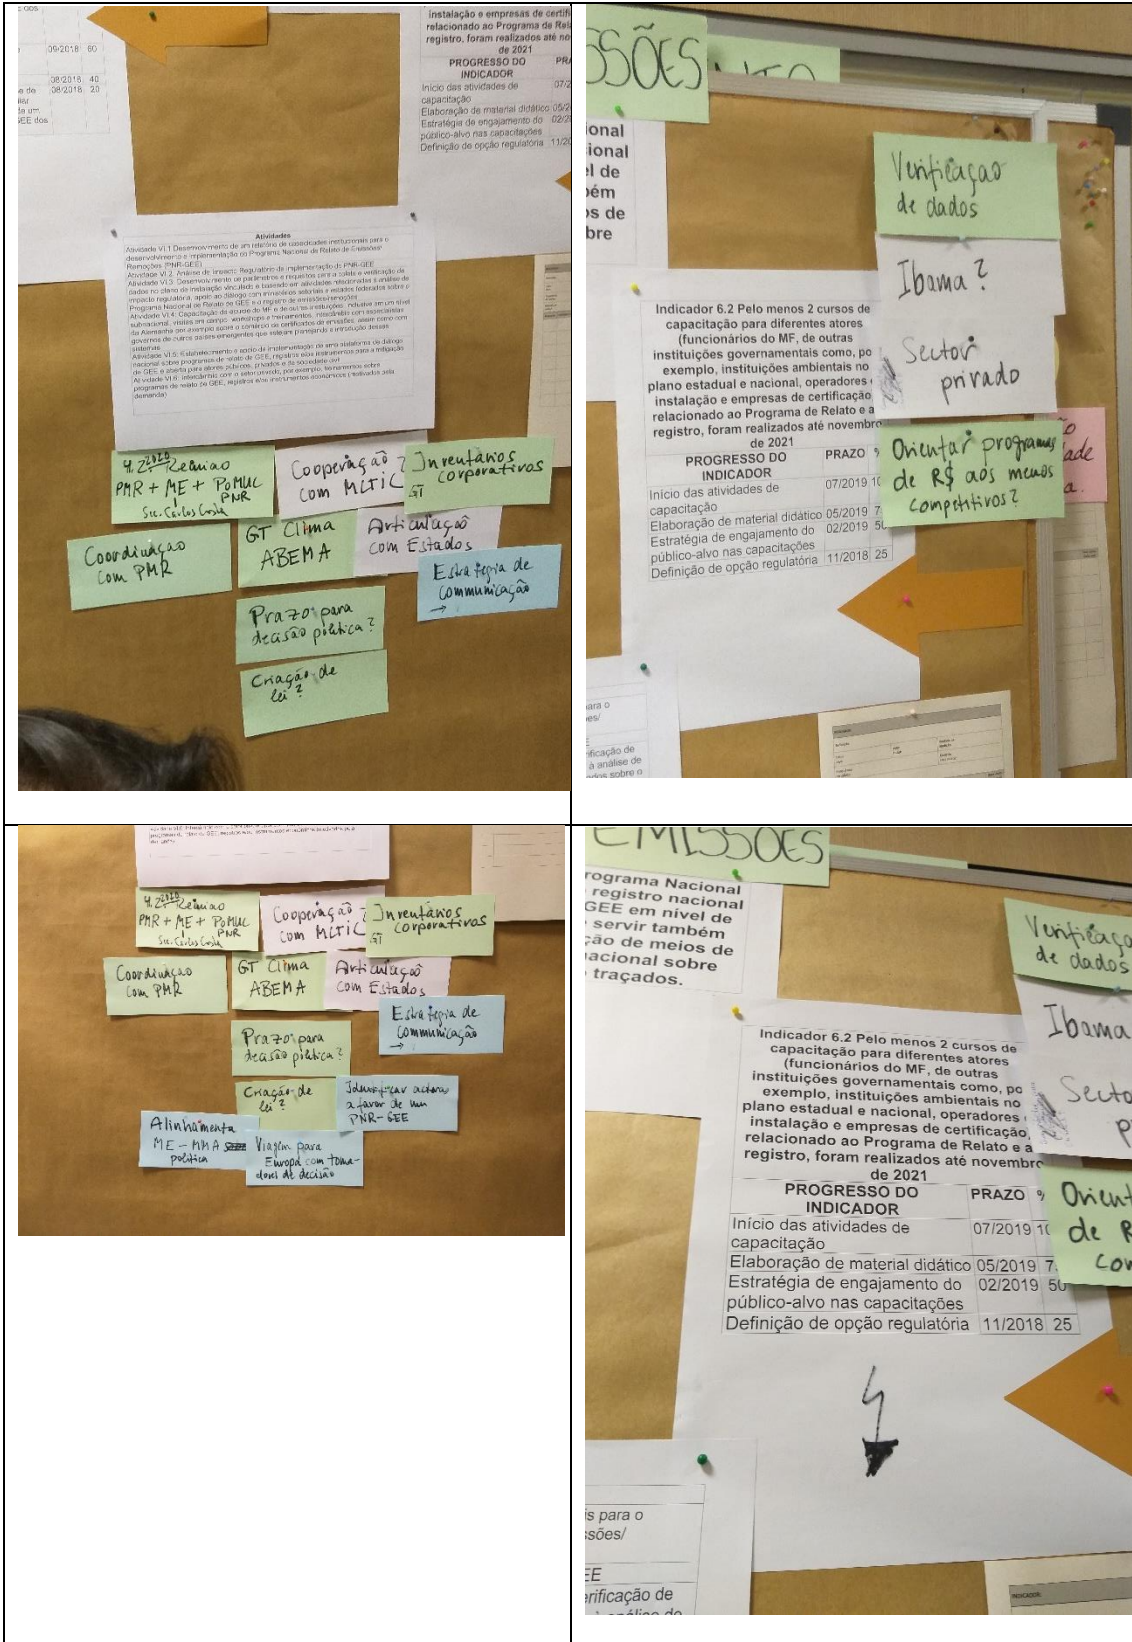

Output 7: Gestão de conhecimento

Não foi trabalhado.

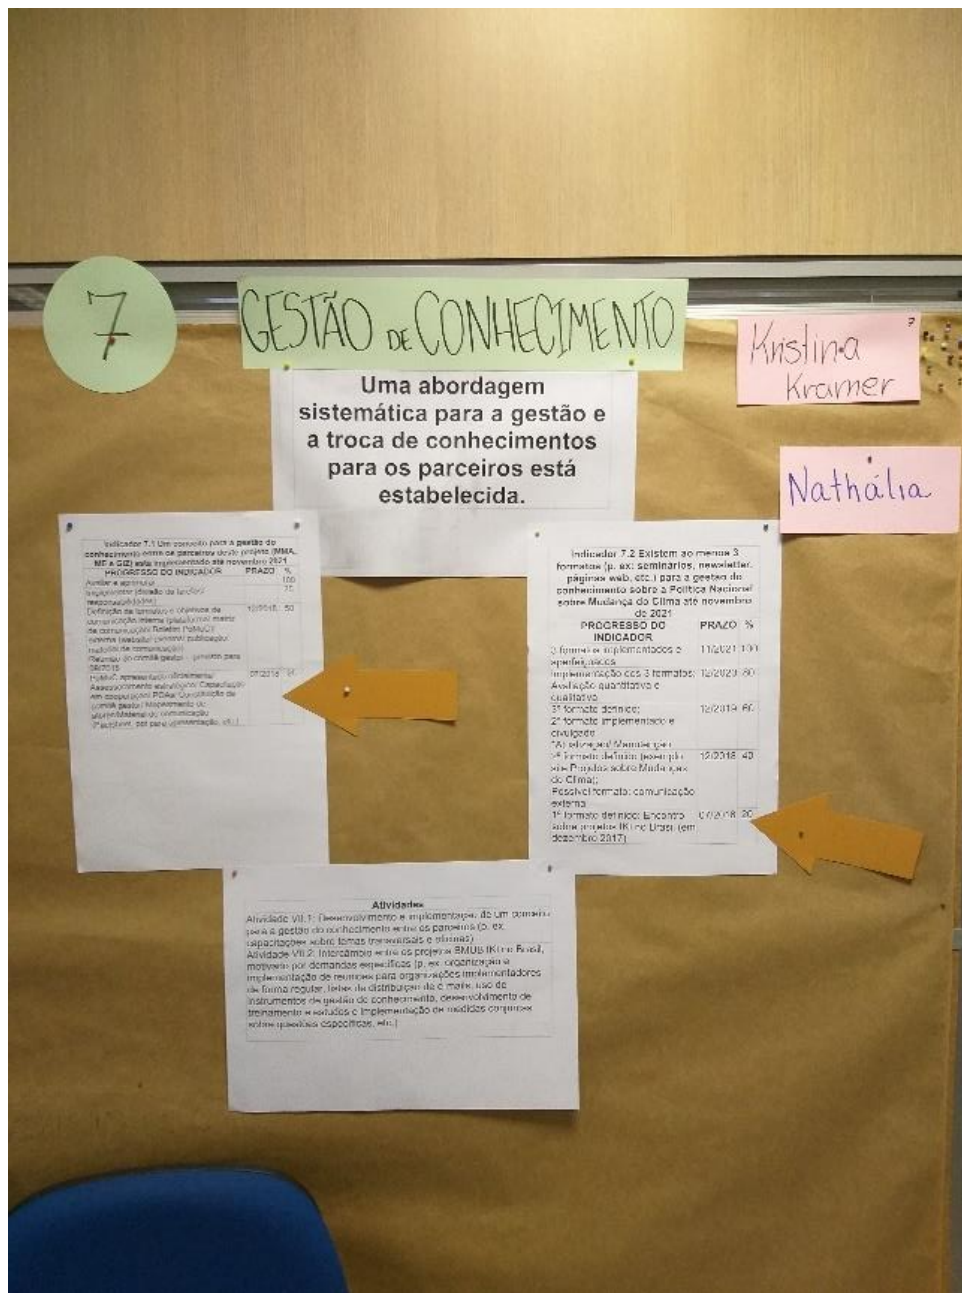

On behalf of:



Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety

Implemented by



Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE



PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Anexo IV: Roadmap

Roadmap PoMuC																	
desenvolvida no dia 20/11/19 na oficina de planejamento entre GIZ, MMA & ME																	
Ação	Solicitação de extensão do prazo para assinatura do TdE	Enviar ofício e nova proposta REDD+ para GIZ	Definição dos pontos focais por Output	Workshops para finalizar revisão dos Outputs	Consolidação da Matriz Lógica	Validação da Matriz Lógica	Elaboração rascunho PCT	Elaboração rascunho proposta	Elaboração rascunho TdE	Submeter ao alto nível do MMA, ME, BMU (retorno)	Retorno estimado do BMU à proposta	Submissão TDE & PCT para ABC (não objeção)	Submissão à CONJUR/MMA	Assinatura TDE & PCT			
Responsável	SRI/ MMA	Clarisse/ MMA	Adriano/ MMA	Focalpoints MMA/ ME/ GIZ	Hugo/ MMA	Focalpoints e coordenação SRI	Focalpoints MMA/ ME/ GIZ e coordenação SRI/ MMA			Focalpoints MMA/ ME e coordenação SRI/ MMA		coordenação SRI/ MMA	coordenação SRI/ MMA	coordenação SRI/ MMA			
	Anja/ GIZ		Hugo/ ME		Anja/ GIZ							Anja/ GIZ	Anja/ GIZ	Anja/ GIZ			Anja/ GIZ
						POAs desenvolvidos até 07.02.20								ABC			
Deadline	22.11.2019	22.11.2019	1. Parcela 22.11.19	13.12.2019	20.12.2019	31.01.2020	28.02.2020			13.03.2020	30.05.2020	12.06.2020	26.06.2020	07.07.2020			
			2. Parcela (onde tem necessidade e de esclarecimento)														

On behalf of:






of the Federal Republic of Germany

Implemented by



MINISTÉRIO DA ECONOMIA MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE



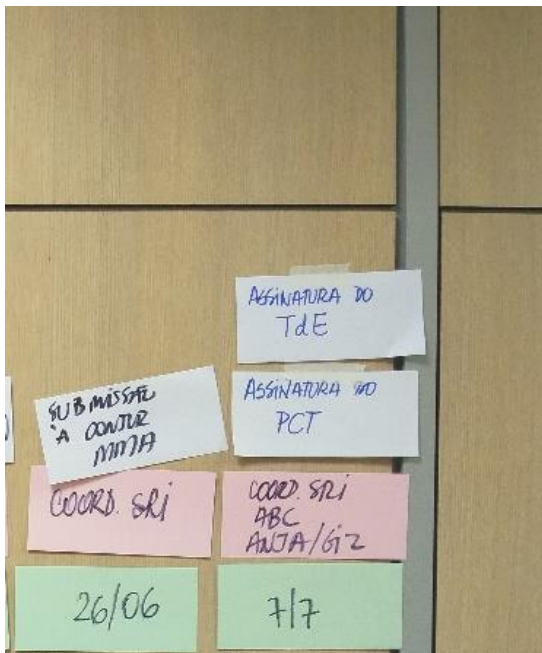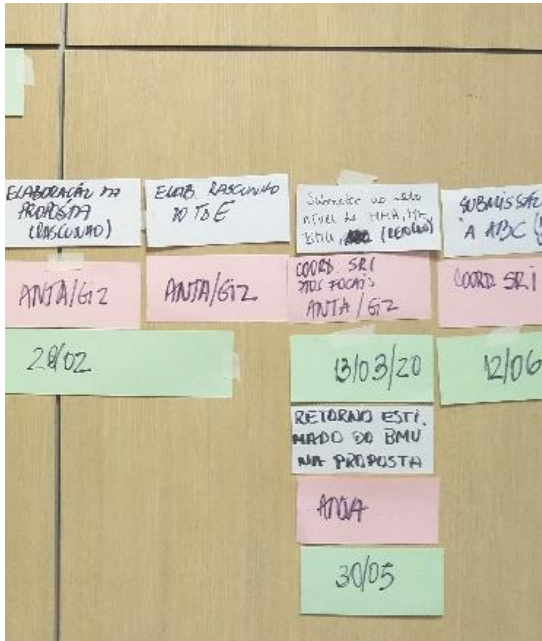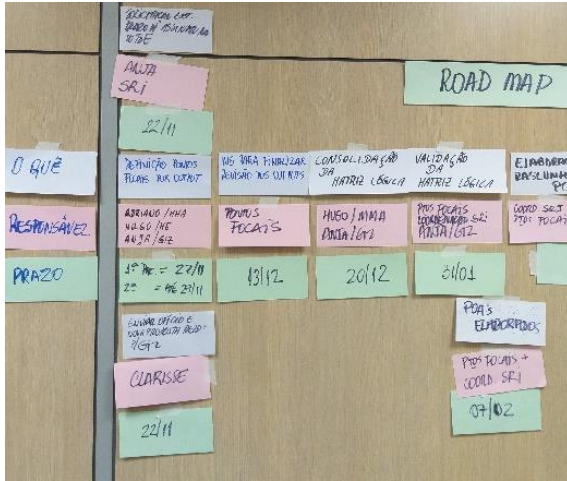

On behalf of:



of the Federal Republic of Germany

Implemented by



MINISTÉRIO DA ECONOMIA MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

